

家原寺配水場配水池更新工事

【第10号】



令和5年 8月

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：13.5% 令和5年7月末時点

夏を通しての暑さが身にこたえる時期となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年8月			令和5年9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工		夏季休暇 8月1日・1日 1日 1日 1日 8月期間 20日（予定）				
配水池工事 No.2	←→		←→	←→	←→	←→
場内配管工事						
場内整備工事						
建築工事						

● 施工箇所（平面図）

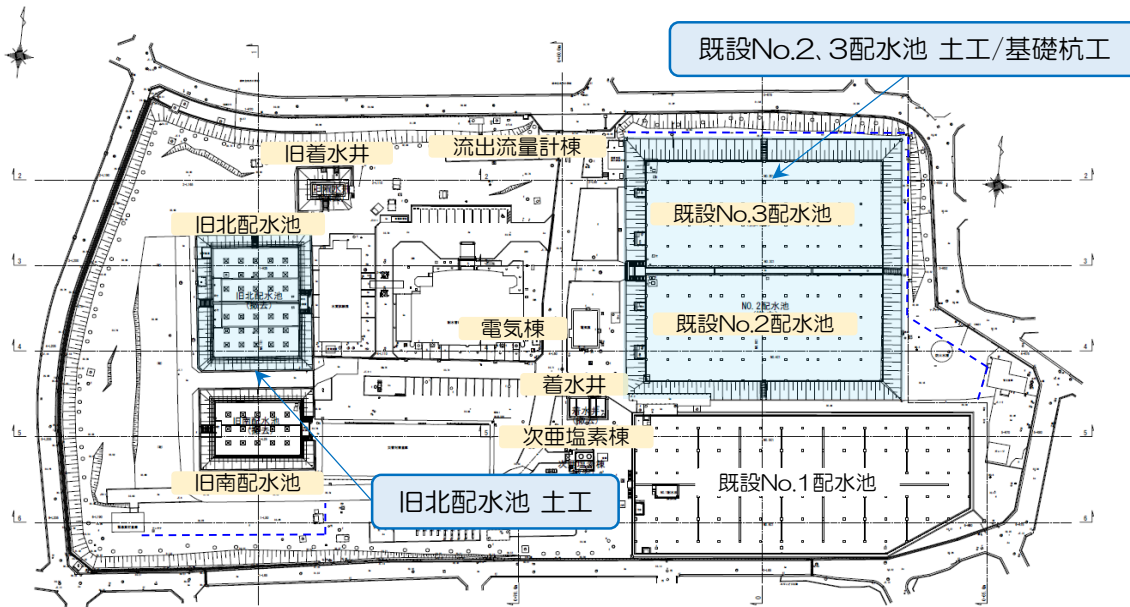

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

大型ダンプトラックで土砂の運搬を行っております。9月下旬から基礎杭の運搬を行います。

夏季休暇は上記の工程表の予定となっておりますが、工事の進捗状況により変更となる場合がございます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

## ● 作業内容

令和5年8月

土工：東側の既設No.2、3配水池、西側の旧北配水池で土作業（埋戻し）

運搬：土砂運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約6台/日 ・ 10tダンプ：約12台×4回/日

令和5年9月

土工：東側の既設No.2、3配水池で土作業（埋戻し・地盤改良）、西側の旧北配水池で土作業（埋戻し）

運搬：土砂運搬、重機等搬出

基礎杭工：東側の既設No.2、3配水池で基礎杭打設

運搬：杭打ち機等搬入、基礎杭運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約10台/日 ・ 10tダンプ：約10台×4回/日 ・ トレーラー：約6台/月

10tトラック×約10台/月 ・ 15tトラック×約2台/日

## ● 令和5年 7月の工事写真

埋戻し状況写真



埋戻し状況写真



現況写真  
7月31日現在



## ● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：石王 甚汰（いしおう じんた）
- (2) 所属：大日本土木(株) 西日本支社 土木工事部
- (3) 担当：施工管理
- (4) 自己紹介



北海道出身の21歳です。スポーツが好きで、特に野球が好きです。今年の4月に入社して6月から初めての現場として、この堺家原寺配水作業所に配属となりました。

現在は北海道とは異なる関西の厳しい夏の暑さに日々奮闘しています。地域の皆様のご理解を得て、安全第一に工事を進めていけるように精進します。これからよろしくお願いします！

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



## ● お問い合わせ先

### 【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺家原寺配水作業所

住所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

