

家原寺配水場配水池更新工事

【第11号】



令和5年 9月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：13.7% 令和5年8月末時点

9月とはいえ残暑厳しく、涼風の待たれるこの頃でございます。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年9月			令和5年10月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	←→ 土運搬	←→ 基礎杭工/準備	←→	←→ 基礎杭工	←→	←→
場内配管工事	←→ 既設管撤去工					
場内整備工事						
建築工事						

● 施工箇所（平面図）

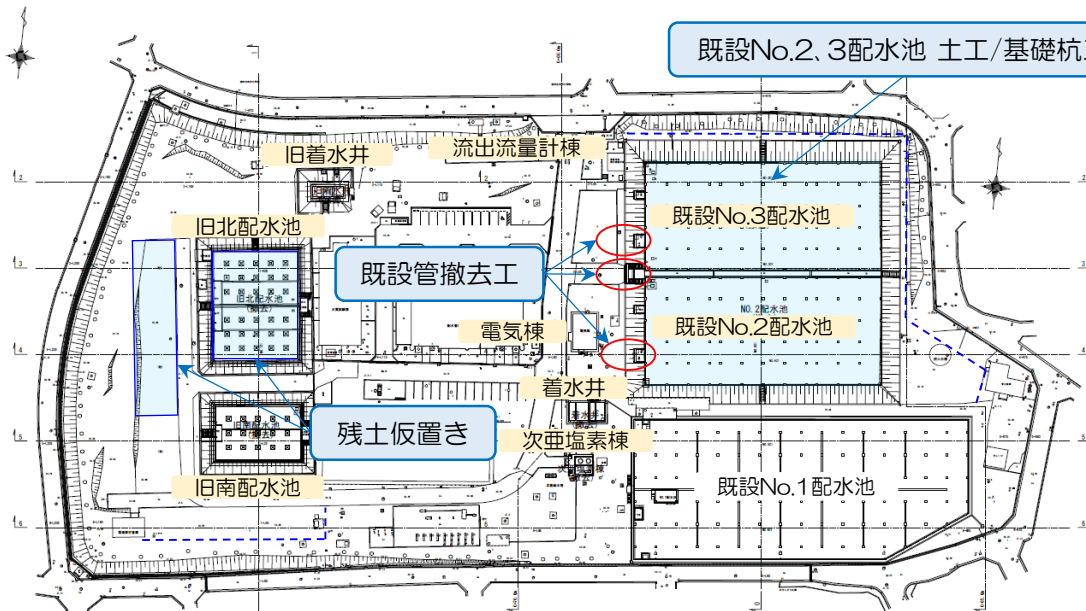

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

9月中旬頃から次工程となり、基礎杭の施工を行います。準備工としまして杭打ち機、クレーン等を夜間にトレーラーを用いて搬入します。9月下旬から大型トラックで基礎杭の運搬を行います。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。夜間の入退場の際は事前にお知らせをします。

● 作業内容

令和5年8月

土工：東側の既設No.2、3配水池で土工作業（埋戻し・地盤改良）、西側の旧北配水池付近で土工作業（土砂搬入）

運搬：土砂運搬、重機等搬入搬出、産業廃棄物搬出

基礎杭工：東側の既設No.2、3配水池で基礎杭打設

運搬：杭打ち機等搬入、基礎杭等運搬

既設管撤去工：東側の既設No.2、3配水池で既設管撤去

・工事用車両の通行予定

普通車：約10台/日 ・ 10tダンプ：約10台×4回/日 ・ トレーラー：約8台/月

10tトラック：約15台/月 ・ 15tトラック：約2台/日

令和5年9月

基礎杭工：東側の既設No.2、3配水池で基礎杭打設

運搬：基礎杭運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約10台/日 ・ 10tトラック：約15台/月 ・ 15tトラック：約2台/日

● 令和5年 8月の工事写真

既設No.2、3配水池
土工 埋戻し作業状況



既設No.2、3配水池
土工 埋戻し完了



8月いっぱいまで既設No.2、3配水池の埋戻し作業が完了しました。9月からは埋戻しをした箇所付近の既設管撤去と次工程の基礎杭工の準備作業を行います。準備作業とは、重機を設置する為の基礎杭打設箇所の地盤改良と基礎杭工用の重機組立を行います。準備作業完了後は、基礎杭の試験施工を行った上で本施工を行います。

● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：増田 敏彦（ますだ としひこ）
- (2) 所属：株式会社 ナンケイ
- (3) 担当：交通誘導警備
- (4) 自己紹介



出身地は大阪府です。交通警備業務に従事して10年近く経ちます。勤務地は主に大阪府内です。以前は自宅から家原寺配水場まで自転車で通勤しておりましたが、最近購入した新車の原動機付自転車（モトアシ）で、毎日快適に通勤ができるようになりました。常日頃から近隣住民様を安全最優先で誘導を行い、無事故、無災害を心掛けて頑張っています。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

