

家原寺配水場配水池更新工事

【第13号】



令和5年 11月

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：18.3% 令和5年10月末時点

暦の上でははや立冬となり、めっきり日脚も短くなってまいりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年11月			令和5年12月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工	大型重機搬出		大型重機搬出			
配水池工事 No.2	基礎杭工			基礎工		
	基礎杭運搬・セメント運搬・産業廃棄物運搬・コンクリート運搬					
場内配管工事						
場内整備工事						
建築工事	基礎杭工			土工	土留め工	土工・基礎工
	基礎杭運搬・セメント運搬					コンクリート運搬

● 施工箇所（平面図）

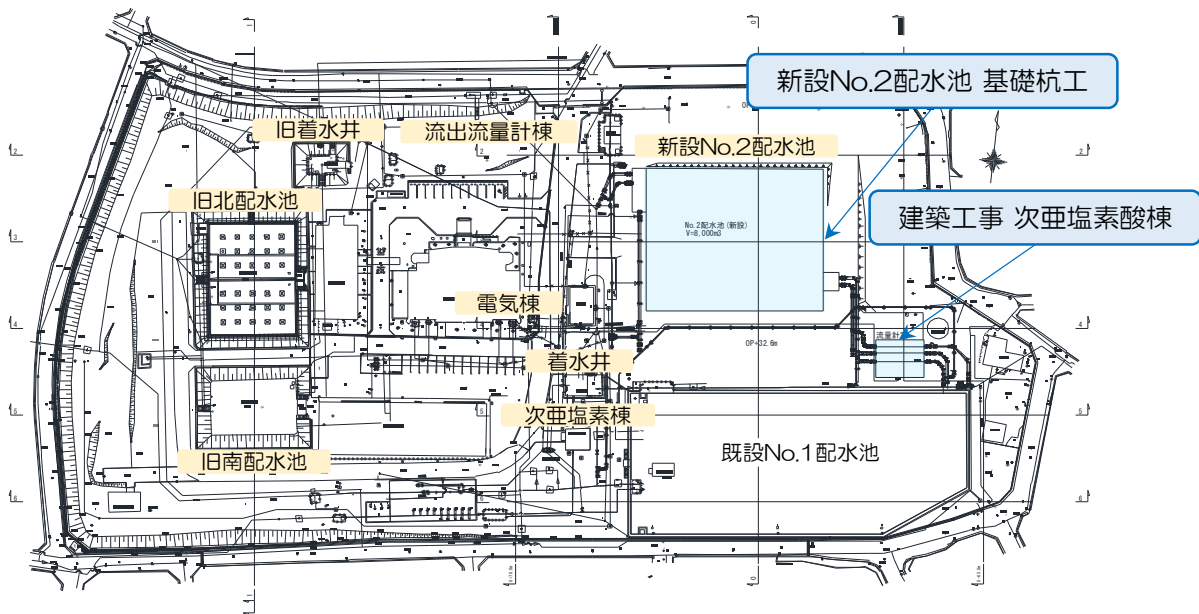

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

トレーラー及びトラックで基礎杭の運搬、タンクローリーでセメントの運搬を行っております。

11月中頃からダンプを用いて産業廃棄物の運搬を行います。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。夜間の入退場の際は事前にお知らせをします。

## ● 作業内容

令和5年11月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で基礎杭打設、杭頭処理工、土工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で基礎杭打設、土工

運搬：杭運搬、セメント運搬、産業廃棄物搬出

### ・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日 ・ トレーラー：約2台/日 ・ 15tトラック：約2台/日 ・ 10tタンクローリー：約2台/日  
10tダンプ：約6台×4回/日 ・ 特殊車両：4台/月

令和5年12月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で杭頭処理工、土工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で基礎杭打設、土留め工、土工、基礎工

運搬：産業廃棄物搬出、鋼材運搬、コンクリート運搬

### ・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日 ・ 10tトラック：約4台/月 ・ 10tダンプ：約6台×4回/日  
コンクリートミキサー車：約5台×4回/日 ・ コンクリートポンプ車：約2台×1回/日

## ● 令和5年 10月の工事写真

新設No.2配水池  
基礎杭 施工状況



新設No.2配水池  
基礎杭 施工状況



新設No.2配水池  
基礎杭 施工状況



## ● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：岸田 智之（きしだ ともゆき）
- (2) 所属：三国産業 株式会社
- (3) 担当：杭工事
- (4) 自己紹介



出身地は大阪府です。杭工事の施工管理に従事して12年になります。工事の担当は主に大型の重機を使用して施工する工事の管理業務です。

これから寒い時期に入りますので、体調管理と安全作業を心掛けて頑張っていきます。どうぞ宜しくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



## ● お問い合わせ先

### 【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

