

家原寺配水場配水池更新工事



令和5年 12月

【第14号】

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：19.9% 令和5年11月末時点

師走を迎え何かと慌ただしい時期となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年12月			年末年始長期休暇	令和6年1月		
	上旬	中旬	下旬		上旬	中旬	下旬
準備工							
配水池工事 No.2	基礎杭工				基礎杭工/基礎工		
	産業廃棄物運搬				運搬/産業廃棄物・生コン・鉄筋等		
場内配管工事							
場内整備工事							
建築工事	土工	土留め工	次亜塩素棟/土工		次亜塩素棟/基礎工		
	運搬/土留め材				運搬/生コン・鉄筋等		

● 施工箇所（平面図）

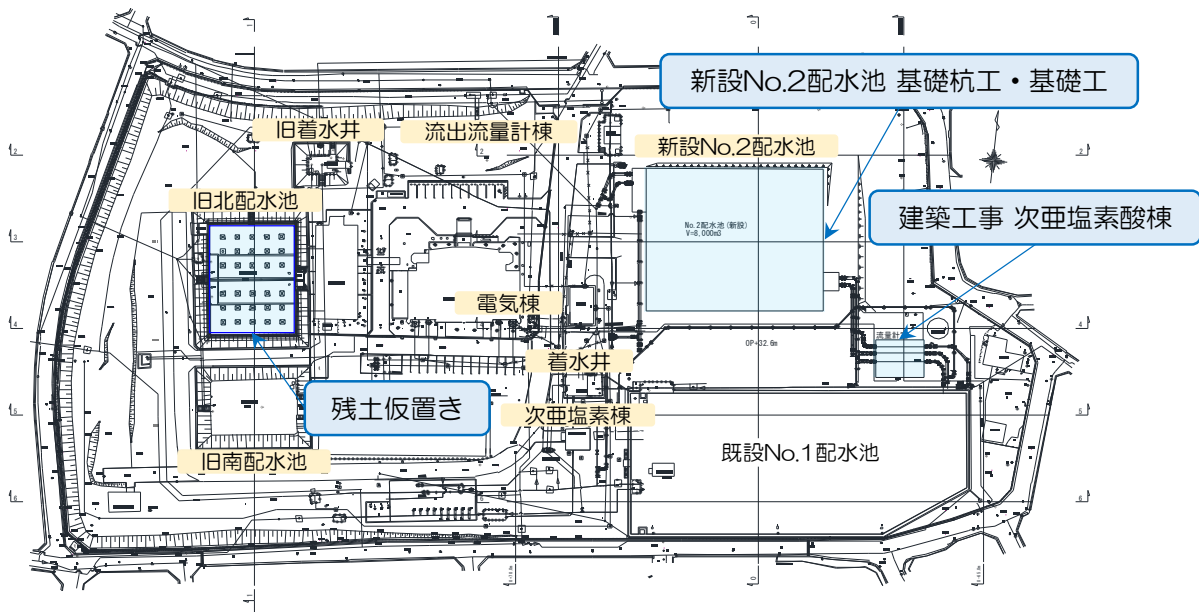

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定） ※年末年始長期休暇：12月29日から1月8日までの予定  
重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

現在、杭頭処理作業（コンクリート杭上部取壊し）に伴い、騒音等で近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしております。誠に申し訳ございません。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和5年12月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で杭頭処理工、土工、杭残土運搬工（汚泥搬出）

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、土留め工

運搬：土留め材運搬、産業廃棄物搬出

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日 ・ 10tトラック：約8台/月 ・ 10tダンプ：約10台×4回/日

令和6年1月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で杭頭処理工、土工、コンクリート殻等運搬、基礎工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、基礎工

運搬：産業廃棄物搬出、鉄筋運搬、コンクリート運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日 ・ 10tトラック：約12台/月 ・ 10tダンプ：約5台×4回/日

コンクリートミキサー車：約5台×4回/日 ・ コンクリートポンプ車：約2台×1回/日

● 令和5年 11月の工事写真

新設No.2配水池  
基礎杭残土撤去状況



新設No.2配水池  
基礎杭残土撤去状況



新設No.2配水池  
杭残土運搬（汚泥搬出）状況



● 今月のトピックス

新設するNo.2配水池と次亜塩素棟の基礎杭打設作業が完了しました。現在は基礎杭打設時に削孔した際に発生した土と杭を固定させる為に使用したセメントミルクが混ざった汚泥を撤去して、産業廃棄物として搬出しております。また、次工程の準備作業として杭頭処理（コンクリート杭上部取壊し：写真②）を行っております。


【基礎杭打設完了】



【杭頭処理事業状況】



配水場平面図



■：杭残土撤去・杭頭処理事業箇所

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

