

家原寺配水場配水池更新工事

✳️ 工事通信

令和6年 1月

【第14号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：20.5% 令和5年12月末時点

初春を迎え、ますますご壮健のことと拝察いたします。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和6年1月			令和6年2月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
準備工							
配水池工事 No.2	年末年始長期休暇	基礎杭工			基礎工		
		産業廃棄物運搬			運搬/生コン・鉄筋等		
場内配管工事							
場内整備工事							
建築工事	年末年始長期休暇	次亜塩素棟/土工・基礎工			次亜塩素棟/土工・基礎工		
		運搬/生コン・鉄筋等			運搬/生コン・鉄筋等		

● 施工箇所（平面図）

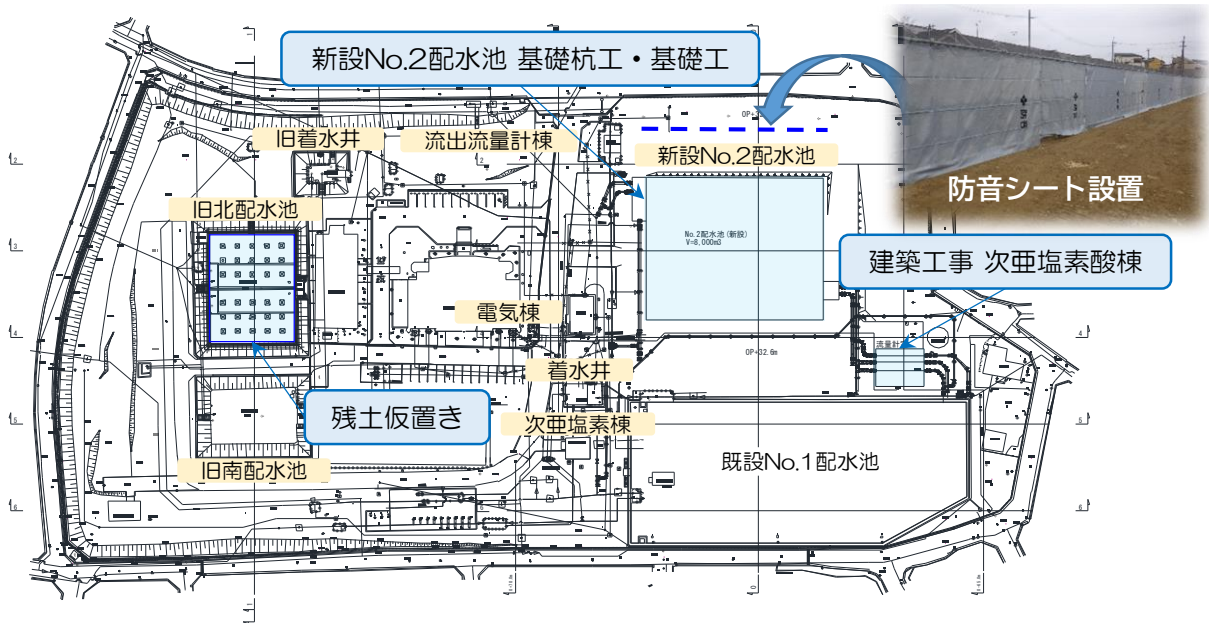

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定） ※年末年始長期休暇：12月29日から1月8日までの予定
重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

杭頭処理作業（コンクリート杭上部取壊し）に伴い、騒音等で近隣住民の皆様にはご迷惑をお掛けしております。誠に申し訳ございません。騒音対策として作業場所の北側に防音シートを設置しました。（上部の青色点線箇所）

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年1月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で杭頭処理工、土工、産業廃棄物運搬

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、土留め工、基礎工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、産業廃棄物搬出

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約12台/月・10tダンプ：約2台×4回/日・クレーン車：1台×2回/週
コンクリートミキサー車：約5台×4回/日・コンクリートポンプ車：約2台×1回/日

令和6年2月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で土工、基礎工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、基礎工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、重機搬出

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約5台×4回/日

コンクリートミキサー車：約5台×4回/日・コンクリートポンプ車：約2台×1回/日・トレーラー：約4台/月

● 令和5年 12月の工事写真

新設No.2配水池
杭頭処理状況



新設No.2配水池
杭頭処理状況



新設次亜塩素棟
掘削状況



● 今月の現場従事者 紹介

現在、私たちの作業所でも技能実習生に従事して頂いております。「外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていく為、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」と厚生労働省のホームページに記載があります。出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るもので、期間は最長5年とされております。

【今月の紹介者】

- (1) 名 前：ファム クアン チェン (写真左側)
名 前：ブン チェン アイン (写真右側)
- (2) 出身国：ベトナム
- (3) 所 属：有限会社卓攝
- (4) 担 当：土工



【作業状況】



工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所
住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1 (家原寺配水場内)
TEL：072-360-4033
FAX：072-360-4173
担当者：塩尻 (現場代理人)、岡田 (現場職員)

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

