

家原寺配水場配水池更新工事



令和6年 2月

【第16号】

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：20.8% 令和6年1月末時点

節分を過ぎ、梅の開花が待たれる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和6年2月			令和6年3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	基礎杭工・基礎工			基礎工		
	運搬／生コン・鉄筋等			運搬／生コン・鉄筋等		
場内配管工事						
場内整備工事						
建築工事	次亜塩素棟／土工・基礎工			次亜塩素棟／土工・基礎工		
	運搬／生コン・鉄筋等			運搬／生コン・鉄筋等		

● 施工箇所（平面図）

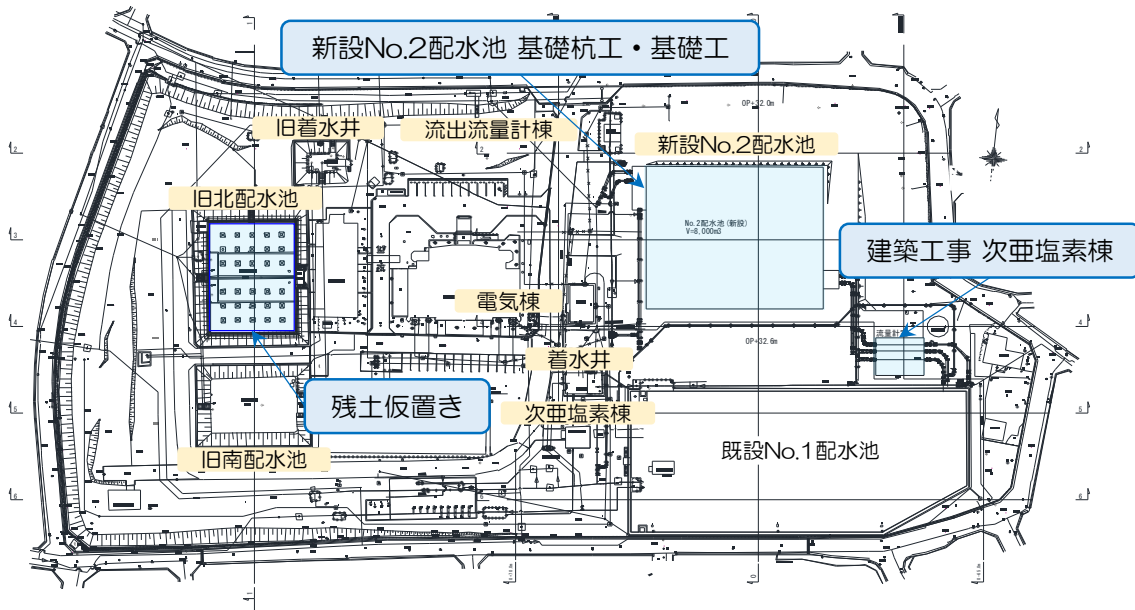

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年2月

基礎杭工：東側の新設No.2配水池で杭頭処理工、土工、産業廃棄物運搬

基礎工：東側の新設No.2配水池で基礎工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、基礎工、足場工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、産業廃棄物搬出、重機搬出

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約2台×4回/日・クレーン車：1台×2回/週  
 コンクリートミキサー車：約6台×5回/日・コンクリートポンプ車：約2台×1回/日・トレーラー：約3台/月

令和6年3月

基礎工：東側の新設No.2配水池で基礎工、足場工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で土工、基礎工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、重機搬出

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約5台×4回/日・クレーン車：1台×2回/週  
 コンクリートミキサー車：約6台×5回/日・コンクリートポンプ車：約2台×1回/日・トレーラー：約4台/月

● 令和6年 1月の工事写真

新設No.2配水池  
杭頭処理状況



新設次亜塩素棟  
コンクリート打設状況



新設次亜塩素棟  
コンクリート打設状況



● 今月の現場従事者 紹介

・建築工事 新設次亜塩素棟（地上1F、地下1F）について


昨年11月末頃から掘削を開始しまして、地上部に次亜塩素注入設備、電気計装室、地下部に新設配水池配水池への流入量を調整する弁室を設けた建築工事を行っております。

完成は2024年8月頃を見込んでおります。

【基礎工 作業状況】※1月末時点



【平面図】

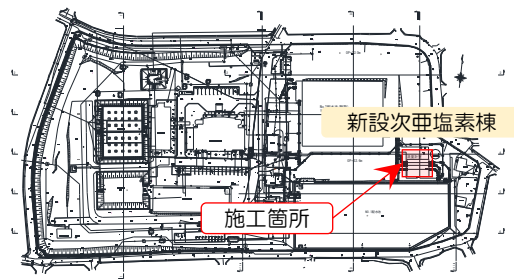

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

