

家原寺配水場配水池更新工事



令和6年 5月

【第19号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：24.3% 令和6年4月末時点

青葉が美しい季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和6年5月			令和6年6月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	基礎工・土工・配管工・タンク組立			基礎工・土工・配管工・タンク組立		
	運搬／生コン・鉄筋・管材等			運搬／生コン・鉄筋・管材・鉄板等		
場内配管工事						
設備工事				流量計室、弁室配管工事		
建築工事	次亜塩素棟／躯体・足場工・鉄骨			次亜塩素棟／躯体・足場工・鉄骨		
	運搬／生コン・鉄筋・鉄骨等			運搬／生コン・鉄筋・鉄骨等		

● 施工箇所（平面図）

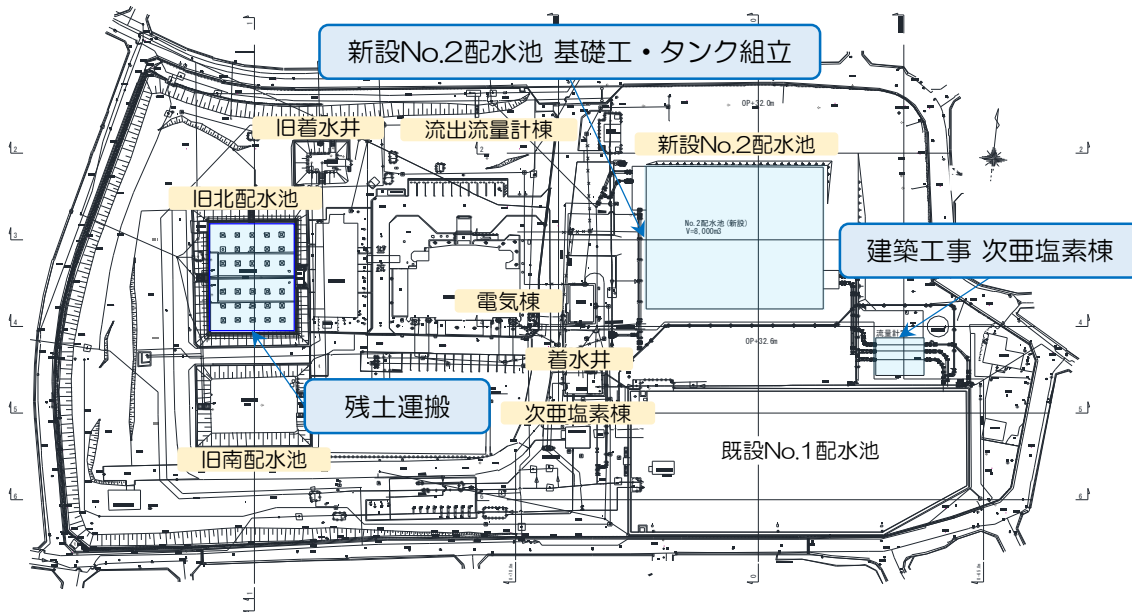

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年5月

基礎工：東側の新設No.2配水池で基礎工、足場工、土工
タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、付帯配管工
建築工事：東側の新設次亜塩素棟で躯体、鉄骨、足場工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、管材運搬、足場・鉄骨等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週
コンクリートミキサー車：約30台/週・コンクリートポンプ車：約1台×1回/週

令和6年6月

基礎工：東側の新設No.2配水池で基礎工、足場工、土工
タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立
設備工事：東側の新設No.2配水池で流量計室、弁室配管工事
建築工事：東側の新設次亜塩素棟で鉄骨、足場工、配管工

運搬：生コン運搬、鉄筋運搬、管材運搬、足場等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週
コンクリートミキサー車：約30台/週・コンクリートポンプ車：約1台×1回/週

● 令和6年 4月の工事写真

家原寺配水場
全体作業状況



新設No.2配水池
コンクリート打設状況



新設次亜塩素棟
施工状況



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：臼田 敏樹（うすだ としき）
- (2) 所属：森松工業株式会社
- (3) 担当：ステンレスタンク築造
- (4) 自己紹介



出身地は岐阜県です。ステンレスタンクの施工管理に従事して11年になります。工事の担当はみなさんの飲み水等を配る配水池を造る工事の管理業務です。これから暑い時期に入りますので、体調管理と安全作業を心掛けて作業します。よろしくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所
住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）
TEL：072-360-4033
FAX：072-360-4173
担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

