

家原寺配水場配水池更新工事



令和6年 8月

【第22号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：47.7% 令和6年7月末時点

夏の日差しが眩しいこの頃、暑さが身にこたえる時期となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和6年8月			令和6年9月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
準備工							
配水池工事 No.2	タンク組立・足場工	8 夏 月 期 1 休 0 暇 日 日 8 休 月 工 1 期 8 間 日 間		タンク組立・足場工			
	運搬/鉄板・足場材等			運搬/鉄板・足場材等			
場内配管工事				土工・配管工			
設備工事	複合工			複合工	配管工・複合工・電気設備工事		
建築工事	次亜塩素棟/設備工・防水・金属・足場			次亜塩素棟/躯体・設備工・防水・金属			
	運搬/生コン・管材・塗料・建築部材等		運搬/生コン・管材・塗料・建築部材等				

● 施工箇所（平面図）

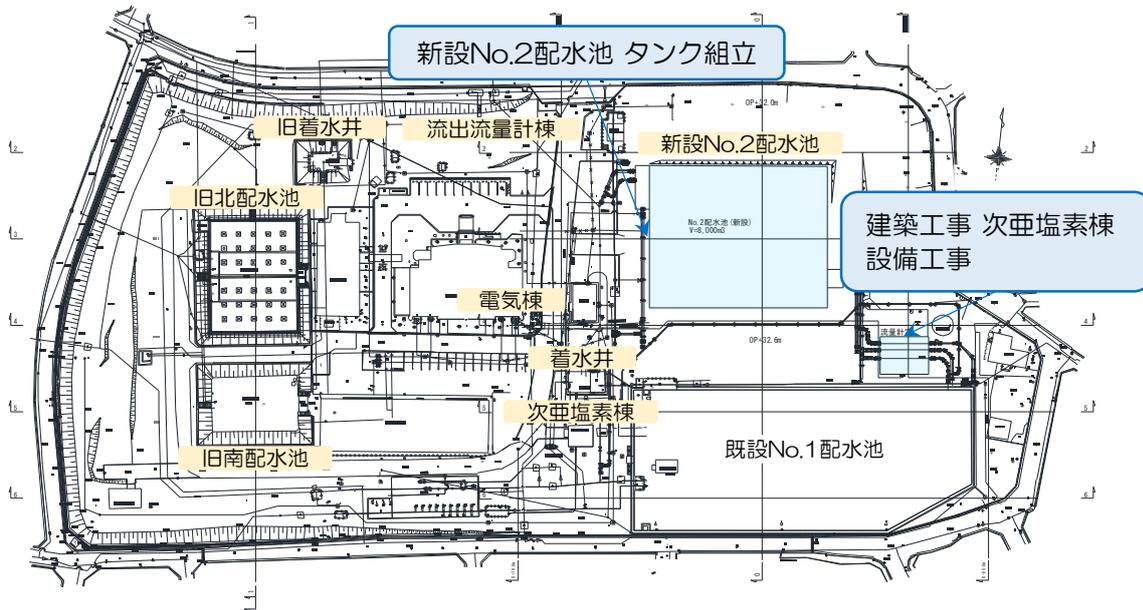

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定） 夏季休暇：8月10日から18日まで
重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年8月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、足場工

設備工事：東側の新設No.2配水池で流量計室、複合工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で躯体、建具、機械・電気設備工、防水工、塗装

運搬：生コン運搬、管材運搬、足場材運搬、鉄板運搬、建築資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

コンクリートミキサー車：約10台/月・コンクリートポンプ車：約1台×1回/月

令和6年9月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、足場工

設備工事：東側の新設No.2配水池で流量計室、弁室配管工事、複合工、電気設備工事

場内配管工事：東側の新設次亜塩素棟付近、土工、配管工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で躯体、土工、機械・電気設備工、配管工、外部工

運搬：生コン運搬、管材運搬、足場材運搬、鉄板等運搬、建築資材、電機・機械設備資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

コンクリートミキサー車：約5台/月・コンクリートポンプ車：約1台×1回/月

● 令和6年 7月の工事写真

ステンレスタンク
組立状況



ステンレスタンク
組立状況



次亜塩素棟
施工状況



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：上田 一斗 (うえだ いつと)
- (2) 所属：大日本土木(株) 西日本支社 土木工事事務部
- (3) 担当：施工管理
- (4) 自己紹介



大阪府河南町出身の23歳です。新入社員としての研修を終え、6月から初めて堺家原寺配水作業所に配属になりました。趣味のボルダリングで体力作りに励んでいます。

仕事内容としては現場の管理業務をしております。現場内で協力会社が安全に作業ができるように場内の整理整頓、工事状況の写真撮影及び写真整理などを主に行っております。熱中症にならないように安全第一で工事を進めていきたいと思っております。長い工事になります。これからよろしくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺家原寺配水作業所

住所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1 (家原寺配水場内)

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻 (現場代理人)、岡田 (現場職員)

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

