

家原寺配水場配水池更新工事



令和6年 10月

【第24号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：52.7% 令和6年9月末時点

夏が終わり秋の涼しさを感じる季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和6年10月			令和6年11月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	タンク組立・付帯工・付帯配管工			タンク組立・付帯工・付帯配管工・試験		
	運搬／鋼材・足場材等			運搬／鋼材・管材等		
場内配管工事	土工・配管工			土工・配管工		
	運搬／管材等			運搬／管材等		
設備工事	電気設備工事・次亜塩素素注入設備工事・複合工・配管工・足場工					
	運搬／塗料・管材・機械・電材・足場材等			運搬／管材・機械・電材等		
建築工事	次亜塩素棟／設備工・金属・塗装・左官			次亜塩素棟／塗装・金属		
	運搬／塗料・建築部材等					

● 施工箇所（平面図）

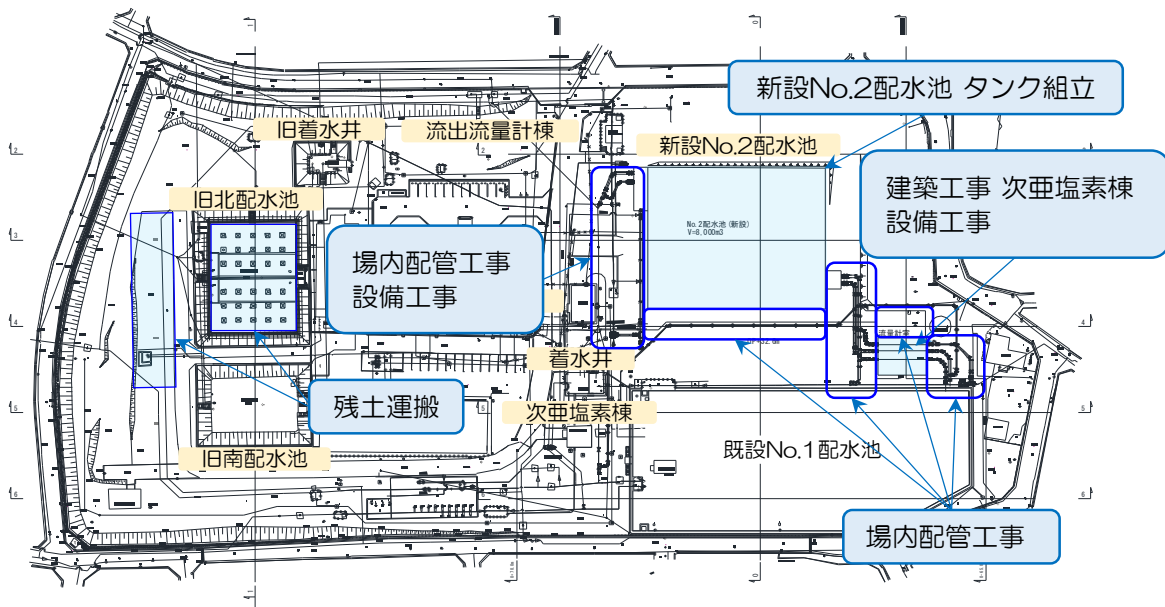

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年10月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、足場工

設備工事：東側の新設No.2配水池で弁室配管工事、次亜塩素棟で複合工、電気設備工事、次亜塩素注入設備工事

場内配管工事：東側の新設次亜塩素棟付近・新設No.2配水池西側付近、土工、配管工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で左官、塗装、建具、土工

運搬：管材運搬、足場材運搬、鋼材等運搬、電機・機械設備資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約25台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

令和6年11月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、試験

設備工事：東側の新設No.2配水池で弁室配管工事、次亜塩素棟で電気設備工事、次亜塩素注入設備工事

場内配管工事：新設No.2配水池西側付近、土工、配管工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で塗装、建具、土工

運搬：管材運搬、鋼材運搬、建築資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

● 令和6年 9月の工事写真

ステンスタック
組立状況



次亜塩素棟
施工状況（屋内配管）



次亜塩素棟
施工状況（屋内左官）



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：筒井 勇次
- (2) 所属：森松工業株式会社
- (3) 担当：ステンスタック築造
- (4) 自己紹介



私は愛知県出身です。建設業に携わって30年になります。今まで様々な経験や苦勞をしてきましたが、いまだこの業界に留まっているのは物づくりに魅力を感じているからなのかもしれません。この現場においても魅力を感じながら仕事をし、地元住民の皆さまに迷惑をかけないよう、日々努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

