

家原寺配水場配水池更新工事



令和6年 11月

【第25号】

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：59.9% 令和6年10月末時点

菊花の季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和6年11月			令和6年12月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	← 運搬/鋼材・足場材等 →	← タンク組立・付帯工 →		← タンク組立・付帯工・試験・検査 →	← 運搬/機材・足場材等 →	
場内配管工事	← 土工・配管工 →	← 運搬/管材等 →		← 土工・配管工・試験 →		
設備工事	← 電気設備工事・次亜塩素素注入設備工事・複合工・配管工・足場工 →	← 運搬/管材・機械・電材・足場材等 →		← 次亜塩素素棟/試験・検査 →		
建築工事	← 次亜塩素素棟/設備工・金属・塗装・左官 →	← 運搬/塗料・建築部材等 →				

● 施工箇所（平面図）

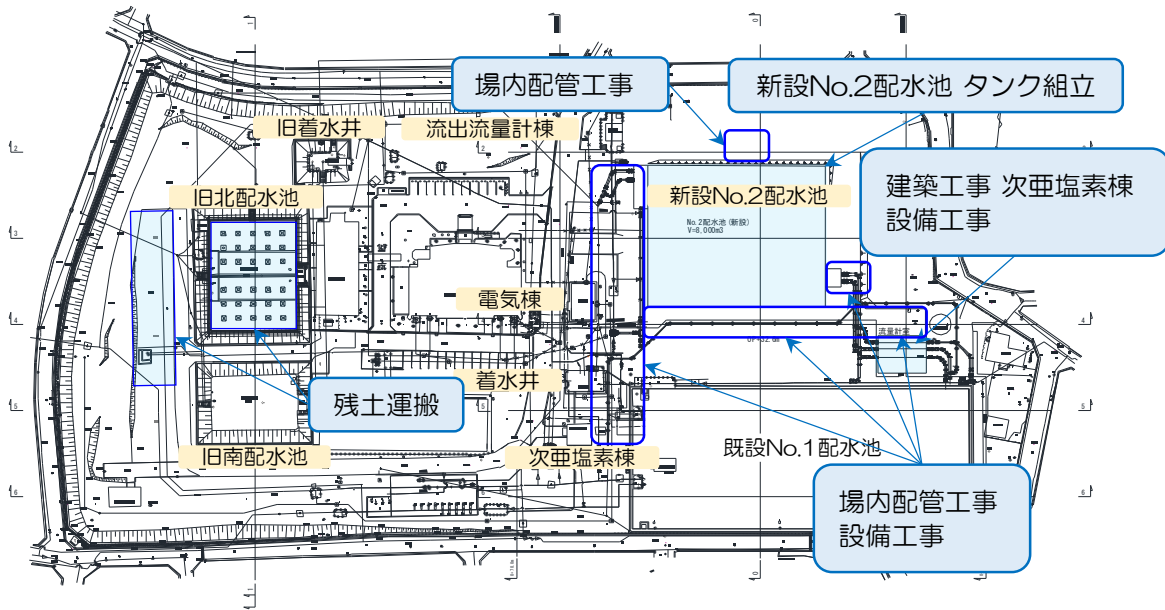

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

## ● 作業内容

令和6年11月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、足場工

設備工事：東側の新設No.2配水池で弁室配管工事、次亜塩素棟で複合工、電気設備工事、次亜塩素注入設備工事

場内配管工事：東側の新設次亜塩素棟付近・新設No.2配水池南・西側付近、土工、配管工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で塗装、建具、土工

運搬：管材運搬、足場材運搬、鋼材等運搬、電機・機械設備資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約25台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

令和6年12月

タンク組立：東側の新設No.2配水池でタンク組立、足場工、試験

設備工事：東側の新設No.2配水池で弁室配管工事、次亜塩素棟、弁室等で電気設備工事

場内配管工事：新設No.2配水池西側・北側付近、土工、配管工

建築工事：東側の新設次亜塩素棟で試運転

運搬：管材運搬、足場材運搬、電機・機械設備資材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

## ● 令和6年 10月の工事写真

ステンスタック  
組立状況



場内配管工事  
施工状況



次亜塩素棟  
施工状況



## ● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前： 藏元 武輝（くらもと たけき）
- (2) 所属： 関西日立株式会社
- (3) 担当： 電気設備工事
- (4) 自己紹介



出身地は兵庫県です。電気工事の施工管理に従事しておりますが、経験がまだまだ浅いため、日々勉強しております。日立グループは、安全>品質>納期>コストの優先順位を常に遵守し、お客様、そして社会の安全と安心をお届けすることを基本方針としております。この方針に則り、日々従事してまいります。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



## ● お問い合わせ先

### 【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

