

家原寺配水場配水池更新工事

【第26号】

工事通信

令和6年 12月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：62.3% 令和6年11月末時点

冬の寒気が身にしみる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和6年12月			年末年始長期休暇	令和7年1月		
	上旬	中旬	下旬		上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.2	タンク組立・付帯工・足場工 運搬/鋼材・足場材等			年末年始長期休暇		付帯工	後片付け 運搬/機材等
場内配管工事	土工・配管工 運搬/管材等					土工・配管工	
設備工事	電気設備工事・次亜塩素素注入設備工事・配管工 運搬/管材等					電気設備工事・配管工・複合工 運搬/コンクリート・管材等	
場内整備工事							擁壁工 運搬/コンクリート製品
建築工事	次亜塩素素棟/試運転・検査 運搬/機材等						

● 施工箇所（平面図）

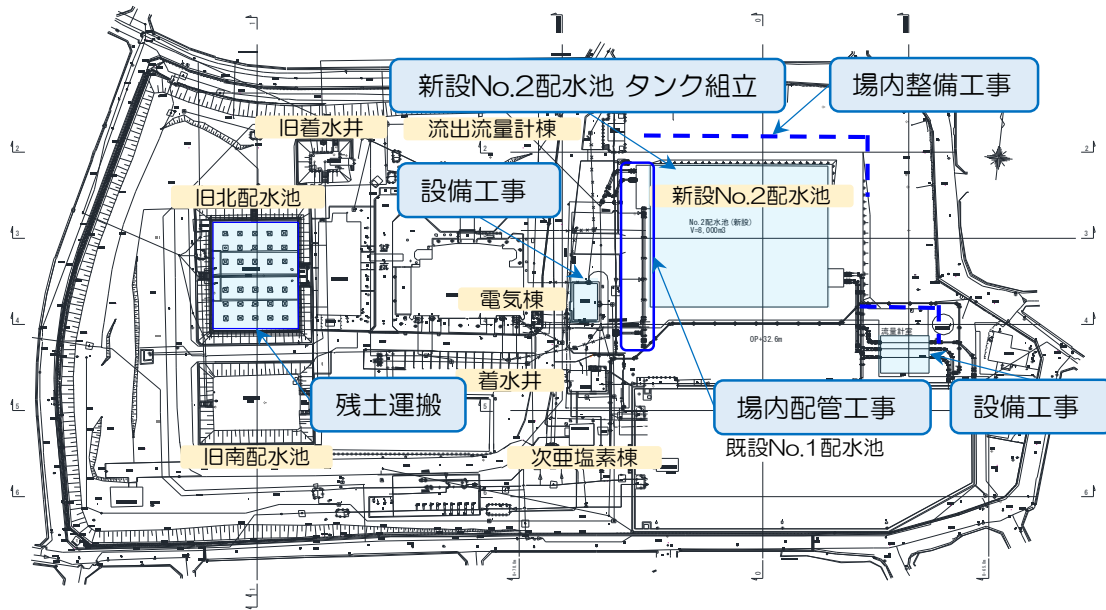

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）※年末年始長期休暇：12月28日から1月5日までの予定
重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和6年12月

タンク組立：新設No.2配水池でタンク組立、足場工、清掃、付帯工、試験

設備工事：新設No.2配水池で電気設備工事、次亜塩素素注入設備工事、試験、配管

場内配管工事：新設No.2配水池南・西側付近で土工、配管

建築工事：東側の新設次亜塩素素棟で試験、試運転

運搬：管材運搬、足場材運搬、鋼材等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：2台×2回/週

令和7年1月

タンク組立：新設No.2配水池で付帯工

設備工事：新設No.2配水池、次亜塩素素棟、弁室等で電気設備工事、配管、型枠、コンクリート打設

場内配管工事：新設No.2配水池西側で土工、配管

場内整備工事：新設No.2配水池、次亜塩素素棟付近で土工、擁壁工

運搬：管材運搬、コンクリート等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：1台×1回/週

コンクリートポンプ車：1台/月・ミキサー車：約5台/月・トレーラー：約2台/月

● 令和6年 11月の工事写真

ステンスタック
清掃状況



場内配管工事
施工状況



電気設備工事
施工状況



● 今月のトピックス


・建築工事 新設次亜塩素素棟（地上1F、地下1F）について

昨年11月末頃に着工しまして、今月完成をいたしました。ご協力ありがとうございました。今後につきましては12月に試験及び試運転などを行いまして、検査を受ける予定となっております。現在は運用開始まで最終調整を行っております。

【新設次亜塩素素棟】



【平面図】

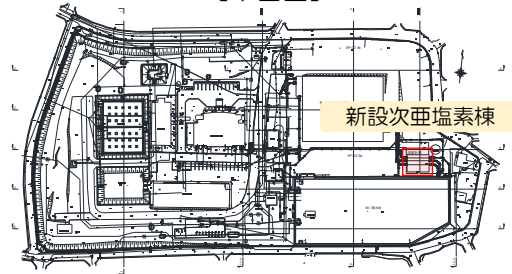

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

