

家原寺配水場配水池更新工事



令和7年 1月

【第27号】

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：63.6% 令和6年12月末時点

冬の寒さが一層厳しい頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年1月			令和7年2月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
配水池工事 No.1	年末年始 長期休暇				既設No.1配水池 解体工事		
					運搬/重機・産業廃棄物等		
配水池工事 No.2				付帯工			
場内配管工事					土工・配管工		
					運搬/重機・管材等		
設備工事		電気設備工事・複合工		電気設備工事・既設次亜塩素素注入設備撤去			
				運搬/コンクリート・鋼材等		運搬/産業廃棄物等	
場内整備工事				土工・擁壁工			
				運搬/コンクリート・コンクリート製品等			

● 施工箇所（平面図）

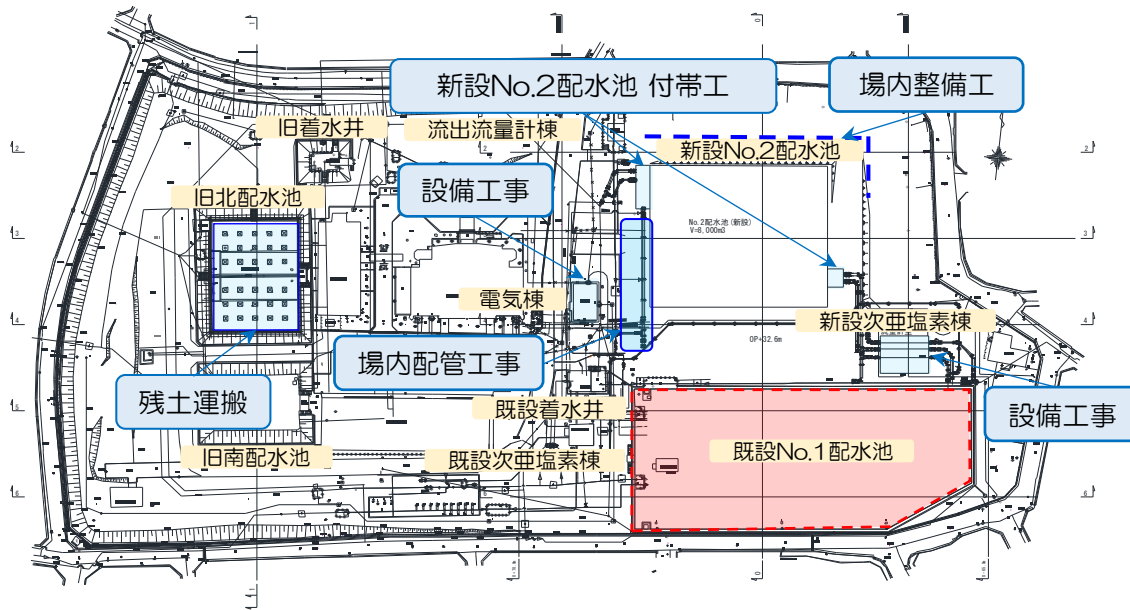

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

2月から配水場南側の既設No.1配水池を解体する予定となっております。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の上、ご協力して頂けますよう、宜しくお願い致します。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年1月

ステンスタンク（ピット）：新設No.2配水池で付帯工（弁室蓋設置）

設備工事：新設No.2配水池で機器設置、コンクリート打設、配水場内で電気設備工事（配水池運用切替作業）

場内配管工事：新設No.2配水池西側付近で土工、配管

場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工

運搬：管材運搬、重機運搬、コンクリート等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約5台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：1台×1回/週

コンクリートポンプ車：1台/月・ミキサー車：約5台/月・トレーラー：約2台/月

令和7年2月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、表土除去、解体

設備工事：配水場内で電気設備工事、既設次亜塩素素注入設備撤去

場内配管工事：新設No.2配水池北側で土工、配管

場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工

運搬：管材運搬、重機運搬、産業廃棄物運搬、コンクリート、コンクリート製品等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約5台/月・10tダンプ：約5台×1回/日・クレーン車：1台×1回/週

コンクリートポンプ車：1台/月・ミキサー車：約5台/月・トレーラー：約2台/月

● 令和6年 12月の工事写真

ステンスタンク  
作業状況



場内配管工事  
施工状況



新設次亜塩素棟  
立会状況



● 今月のトピックス


・新設No.2築造工事（容量：8000m<sup>3</sup>）について

12月に1基目のステンスタンクが完成しました。ご協力ありがとうございました。今後につきましては1月中に配管等を行い、試験及び試運転調整などを行いまして1月末頃に運用を開始する予定となっております。

【新設No.2配水池】



【平面図】

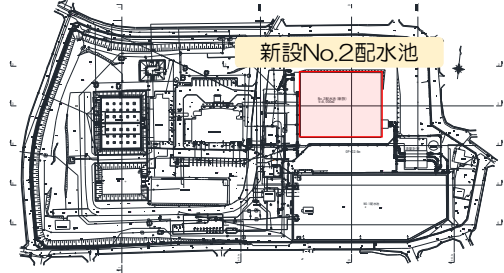

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

