

家原寺配水場配水池更新工事

【第28号】



令和7年 2月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：65.1% 令和7年1月末時点

節分を過ぎ、梅の開花が待たれる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年2月			令和7年3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	既設No.1配水池 解体工事			既設No.1配水池 解体工事		
	← 運搬/仮設材等		← 運搬/仮設材・重機・産業廃棄物等			
場内配管工事				← 土工・配管工		
				← 運搬/管材等		
設備工事	← 電気設備工事・次亜塩素素注入設備工事・複合工			← 電気設備工事		
	← 運搬/管材等					
場内整備工事	← 土工・擁壁工事					
	← 運搬/コンクリート・コンクリート製品等					
場内整備工事	← 既設着水井・既設次亜塩素素棟 解体工事			← 既設着水井・既設次亜塩素素棟 解体工事		
	← 運搬/仮設材等		← 運搬/仮設材・重機・産業廃棄物等			

● 施工箇所（平面図）

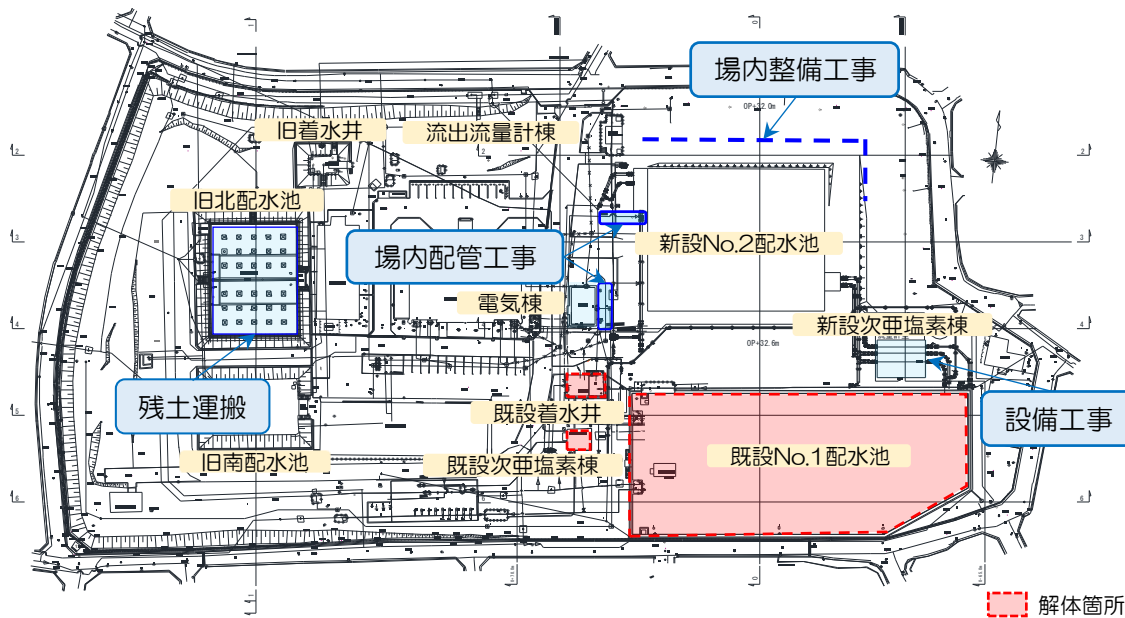

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

2月から配水場南側の既設No.1配水池、既設着水井、既設次亜塩素素棟を解体する予定となっております。

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の上、ご協力して頂けますよう、宜しくお願い致します。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年2月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、足場工、点検室外壁アスベスト除去

設備工事：配水場内で電気設備工事、既設次亜塩素素注入設備撤去

場内配管工事：新設No.2配水池西側で土工、配管

場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工、既設着水井外壁アスベスト除去

運搬：管材運搬、重機運搬、産業廃棄物運搬、コンクリート、コンクリート製品等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約1台×1回/日・クレーン車：1台×1回/週

コンクリートポンプ車：1台/月・ミキサー車：約10台/月・トレーラー：約2台/月

令和7年3月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、表土除去、解体

設備工事：配水場内で電気設備工事

場内配管工事：新設No.2配水池北側で土工、配管

場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工

運搬：管材運搬、重機運搬、産業廃棄物運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約5台/月・10tダンプ：約5台×1回/日・クレーン車：1台×1回/週

トレーラー：約5台/月

● 令和7年 1月の工事写真

設備工事
機器据付状況



場内配管工事
施工状況



場内配管工事
施工状況



● 今月のトピックス

・新設No.2配水池築造工事（容量：8000m³）について

1月30日に1基目のステンレスタンク（新設No.2配水池）の水運用を開始しました。今後につきましては既設No.1配水池を解体しまして、2基目のステンレスタンク築造工事を行っていきます。


【新設No.2配水池】



【新設次亜塩素棟】



【平面図】



【凡例】

- 新設No.2配水池
- 新設次亜塩素棟
- 新設水道管布設
- 既設No.1配水池解体
- 既設着水井解体
- 既設次亜塩素棟解体

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

