

家原寺配水場配水池更新工事

※工事通信

令和7年 4月

【第30号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体


進捗率：67.2% 令和7年3月末時点

桜の樹下を花衣の人々が行き交う、うるわしい春の日となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工 種	令和7年4月			令和7年5月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	既設No.1配水池 解体工事 運搬/重機等			既設No.1配水池 解体工事、土工 運搬/コンクリート殻等、土砂等		
場内配管工事			土工、既設管撤去工、配管工	運搬/管材等		
設備工事	土工・配管工					
場内整備工事	土工・擁壁工事					
場内整備工事	構造物撤去工			既設着水井・既設次亜塩素棟 解体工事 運搬/コンクリート殻等		

● 施工箇所（平面図）

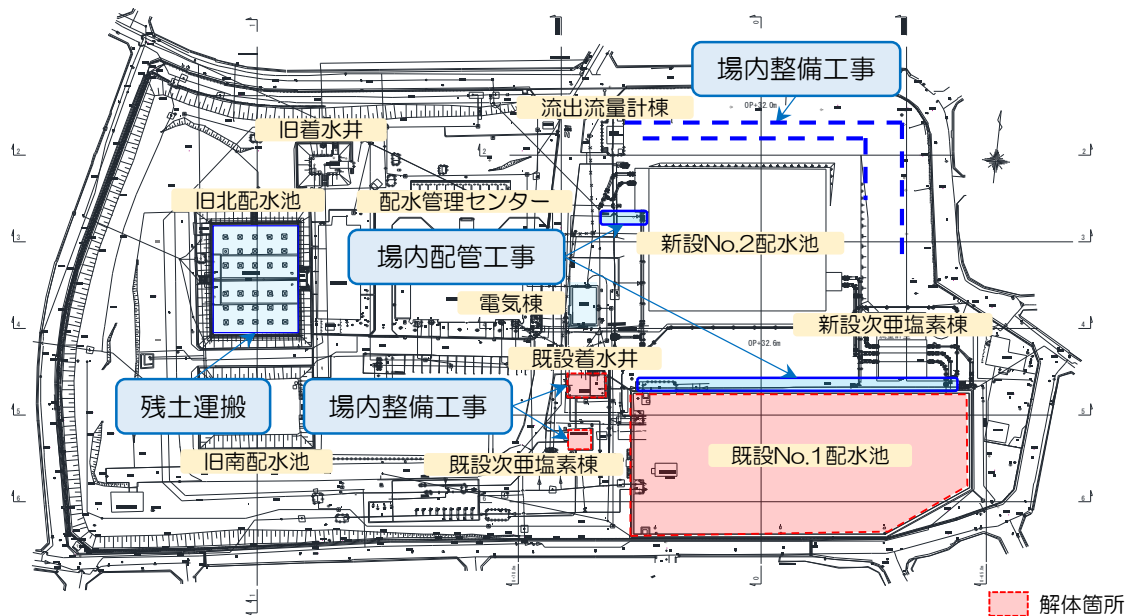

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）
既設No.1配水池解体工事に伴い、表土除去完了後、今月から解体工事に着手します。解体工事に伴い、産業廃棄物（主にコンクリートがら）の搬出も実施します。また、一部大型重機の入退場を深夜に実施します。（2台×2回）ご迷惑をお掛けしますが、環境・安全には十分注意いたします。ご協力をお願い致します。
※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年4月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、表土除去、解体、殻等運搬

場内配管工事：土工、既設管撤去

設備工事：配水場内で配管、土工

場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工、配水場内で既設構造物撤去

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約10台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約2台×6回/日・トレーラー：約8台/月

令和7年5月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：配水場内で既設構造物撤去、解体、殻等運搬、土工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約10台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約15台×3回/日・トレーラー：約3台/月

● 令和7年 3月の工事写真

仮設工事
仮囲い設置（配水場東南側）



配水池工事
既設構造物撤去（表土除去）



場内整備工事
擁壁工事（埋戻し状況）



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：浦 孝彰（うら たかあき）
- (2) 所属：株式会社日立産機システム
- (3) 担当：電気設備工事
- (4) 自己紹介



出身地は和歌山県です。主に上下水道施設の電気設備工事の施工管理に従事して20年以上経ちましたが、毎回電気設備の更新切替作業は緊張感と達成感があります。今回も1基目の配水池を無事に切替ができましたので、一安心です。引続き完成まで安全に作業を進めます。どうぞ宜しくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

