

家原寺配水場配水池更新工事

※工事通信

令和7年 5月

【第31号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体


進捗率：67.9% 令和7年4月末時点

桜若葉がみずみずしい季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工 種	令和7年5月			令和7年6月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配 水 池 工 事 No.1	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工
	運搬／コンクリート殻、土砂等	運搬／コンクリート殻、土砂等	運搬／コンクリート殻、土砂等	運搬／コンクリート殻、土砂等	運搬／コンクリート殻、土砂等	運搬／コンクリート殻、土砂等
場 内 配 管 工 事		土工、既設管撤去工、配管工				
		運搬／管材等				
設 備 工 事						
場 内 整 備 工 事				既設着水井・既設次亜塩素棟 解体工事、土工		
				運搬／コンクリート殻等		
場 内 整 備 工 事						

● 施工箇所（平面図）

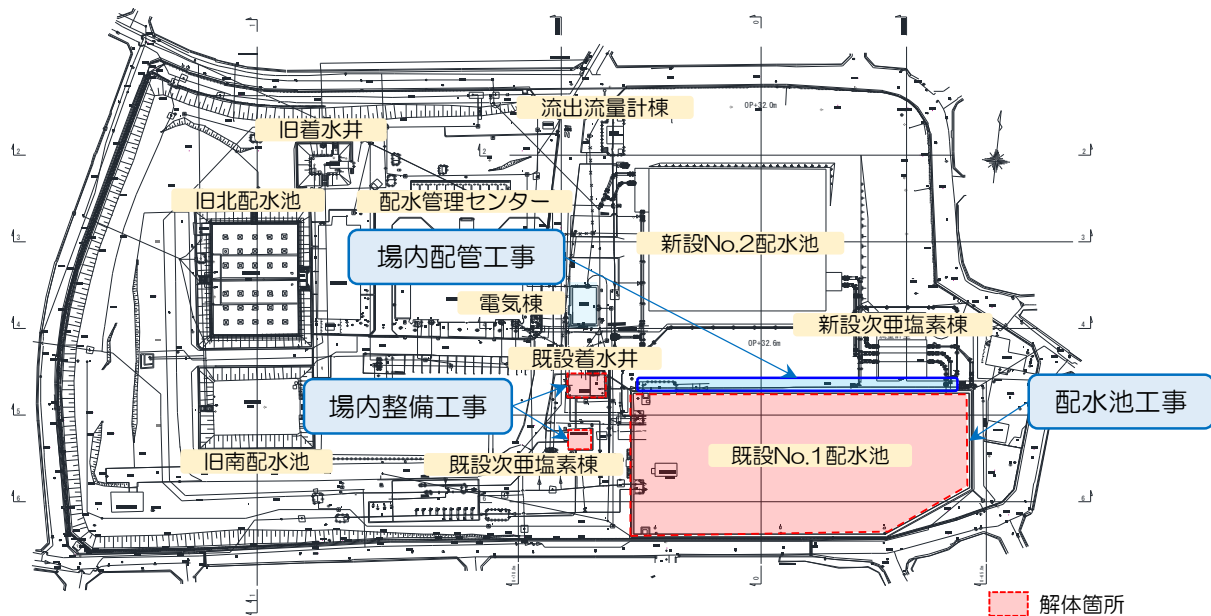

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）産業廃棄物搬出に伴いダンプの入退場が多くなっております。

5月末頃（5月26日開始予定）からは土砂搬入に伴いダンプの入退場が多くなります。近隣住民の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解の上、ご協力をして頂けますよう、宜しくお願い致します。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年5月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工

場内配管工事：土工、既設管撤去

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、管材運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約5台×4回/日・10tダンプ：約15台×3回/日

クレーン：1台/週・トレーラー：約1台/月

令和7年6月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：配水場内で既設構造物撤去、解体、殻等運搬、土工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約5台×4回/日・10tダンプ：約20台×3回/日

トレーラー：約1台/月

● 令和7年 4月の工事写真

配水池工事
解体作業状況



配水池工事
解体作業状況




配水場外周
清掃状況




● 今月の現場従事者 紹介

既設No.1配水池の解体工事につきまして、覆土除去が完了し、圧碎機を用いて解体工事を開始しております。下図の既設No.1配水池平面図の□で囲った配水場南側の解体箇所（端部から5m）につきましては、敷地境界に近いことからワイヤーソーを用いて所定の大きさに切り出して、クレーンで吊り出して撤去をします。ワイヤーソー工法は静かに大きなコンクリートを切断するため、騒音、粉塵が少なくなる工法で周囲の環境に配慮した施工方法となります。

【ワイヤーソー工法概略図】



【家原寺配水場平面図】



【既設No.1配水池平面図】



工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

