

家原寺配水場配水池更新工事

※工事通信

令和7年 6月

【第32号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体


進捗率：68.3% 令和7年5月末時点

初夏の爽やかな風が心地いい季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工 種	令和7年6月			令和7年7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工 運搬/コンクリート殻、土砂、碎石等			既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工 運搬/コンクリート殻、土砂等		
場内配管工事		土工、既設管撤去工、配管工				
設備工事						
場内整備工事	既設着水井・既設次亜塩素棟 解体工事、土工 運搬/コンクリート殻等					
場内整備工事						

● 施工箇所（平面図）

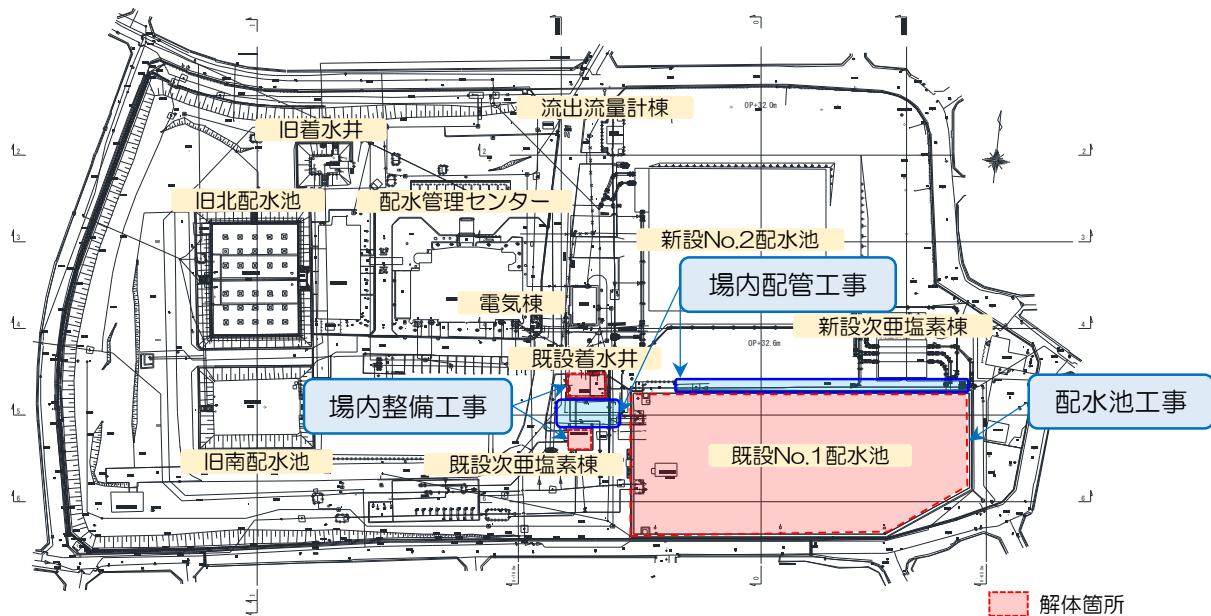

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。

現在、産業廃棄物の搬出及び土砂等の搬入に伴い、ダンプ車両の入退場が大変多くなっております。また、解体工事に伴う騒音や振動により近隣の皆さまにはご迷惑をお掛けしておりますが、できる限り慎重に機械操作を行い、騒音・振動の低減に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年6月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工、土砂等運搬

場内配管工事：土工、既設管撤去

場内整備工事：配水場内で既設構造物撤去、解体、殻等運搬、土工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約2台×6回/日・10tダンプ：約15台×3回/日

クレーン：1台/週・トレーラー：約1台/月

令和7年7月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工、土砂等運搬

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約5台×4回/日・10tダンプ：約15台×3回/日

クレーン：1台/週・トレーラー：約5台/月

● 令和7年 5月の工事写真

配水池工事
解体作業状況



配水池工事
切断撤去作業状況




配水池工事
切断撤去作業状況



● 今月のトピックス

下記の設置状況写真及び平面図のとおり、配水場北側の道路にカーブミラーを設置しました。カーブミラーを設置した箇所は道路の線形がカーブになっており、見通しが悪く危険性がとても高い場所となっております。カーブミラーを設置したことにより、視認性が向上し、事故の抑制に繋がればと思っております。

【カーブミラー設置状況】

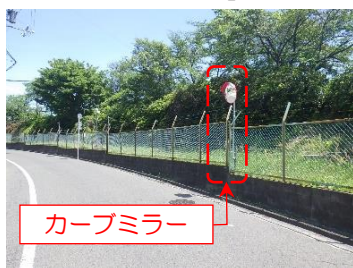

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

