

家原寺配水場配水池更新工事

【第34号】



令和7年 8月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：70.3% 令和7年7月末時点

立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いています。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年8月			令和7年9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	既設No.1配水池 土工、仮設工 運搬/コンクリート殻、土砂、機械等					
配水池工事 No.1		夏期休暇・ 8月9日～ 8月17日 （予定）	地盤改良 運搬/セメント	基礎杭工 運搬/機械、基礎杭、セメント等		
場内配管工事	土工、既設管撤去				土工、既設管撤去、配管 運搬/管材等	
場内整備工事						雨水貯留池/土工 運搬/碎石、ブロック等
場内整備工事			構造物整備工事/構造物撤去 運搬/コンクリート殻、機械等			

● 施工箇所（平面図）

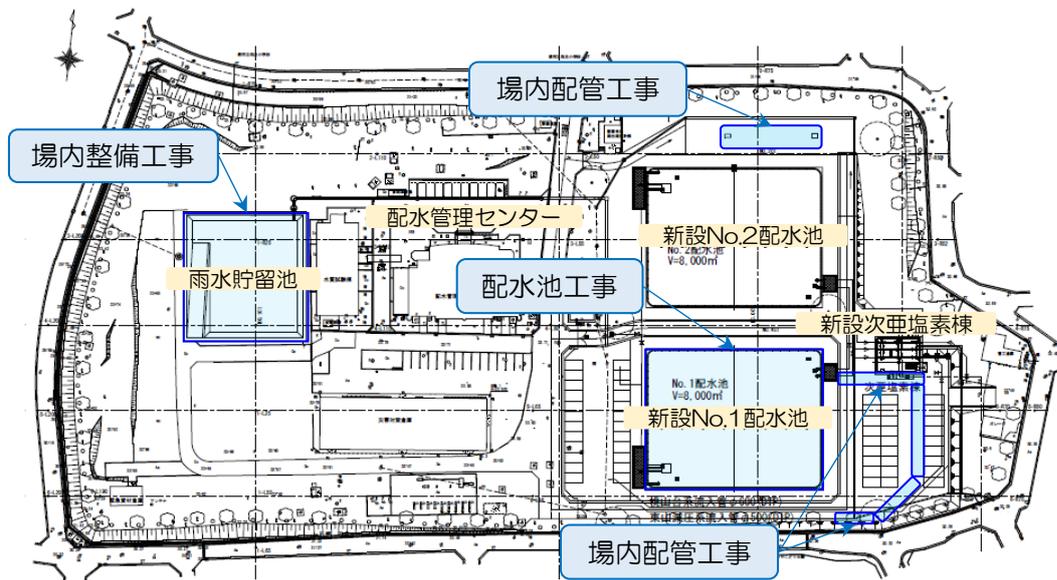

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。

現在、土砂搬入に伴い、ダンプ車両の入退場が大変多くなっております。今月末から次工程の基礎杭工の準備作業を行いまして、基礎杭打設作業を行う予定です。作業の際は慎重に機械操作を行い、騒音・振動の低減に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。夏季休暇は8月9日から17日までの予定です。

● 作業内容

令和7年8月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、殻等運搬、土工、土砂等運搬、地盤改良、基礎工

場内配管工事：土工、既設管撤去

運搬：重機等運搬、産業廃棄物運搬、土砂運搬、基礎杭運搬、セメント運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約25台/月・10tダンプ：約3台×3回/日・10tダンプ：約20台×3回/日

トレーラー：約2台/月・10tタンクローリー：約1台/日

令和7年9月

配水池工事：基礎工、土工、杭残土運搬

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：雨水貯留池護岸ブロック工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、基礎杭運搬、セメント運搬、杭残土運搬、管材運搬、砕石運搬、ブロック運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約3台×3回/日・クレーン：1台/週

トレーラー：約7台/月・トレーラー：約2台/日・10tタンクローリー：約1台/日

● 令和7年 7月の工事写真

配水池工事
土砂搬入状況



配水池工事
解体作業状況



配水池工事
解体作業状況



● 今月のトピックス

既設着水井と既設次亜塩素棟の解体工事が完了しました。騒音、振動を抑制する為、圧砕機を使用して作業を行い、また、粉じん対策として散水車を配置し、周辺の環境に配慮して解体作業を行いました。既設No.1配水池の解体作業は8月上旬には完了する見込みです。引き続き、騒音・振動の低減に努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

【着工前】




【解体状況】



【完了】



【平面図】



工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

