

家原寺配水場配水池更新工事

【第36号】

工事通信

令和7年 10月

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：73.3% 令和7年9月末時点

秋の音が聞こえる美しい季節が到来しました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年10月			令和7年11月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	基礎杭工、杭頭処理工			基礎杭工、杭頭処理工		
	運搬／基礎杭、セメント等			運搬／基礎杭、セメント、機械等		
配水池工事 No.1	土工、基礎工			土工、基礎工		
	運搬／鉄筋、コンクリート等			運搬／鉄筋、コンクリート等		
場内配管工事		土工、基礎工		土工、配管	土工、既設管撤去	
		運搬／コンクリート等		運搬／管材等		
場内整備工事	構造物撤去工					植栽工
準備工	仮設工					

● 施工箇所（平面図）

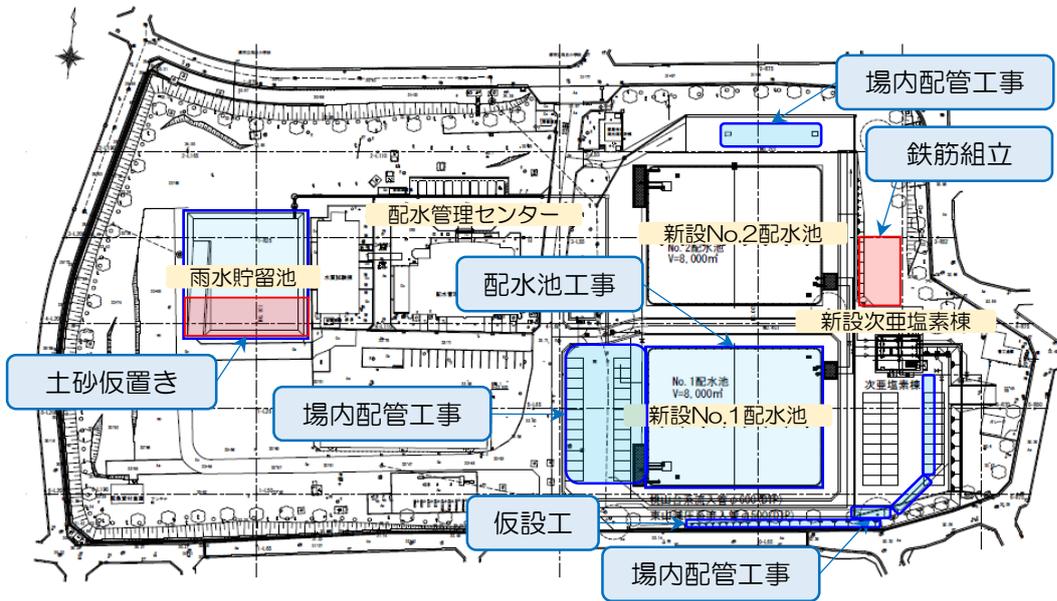

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。

現在、基礎杭工に伴い、材料搬入車両の入退場が大変多くなっております。今月末頃から次工程の杭頭処理工の作業を行います。作業の際は、騒音・振動の低減に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

## ● 作業内容

令和7年10月

配水池工事：基礎杭工、基礎工、土工、杭残土運搬

場内配管工事：土工、基礎工

場内整備工事：構造物撤去

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、基礎杭運搬、セメント運搬、杭残土運搬、碎石運搬、鉄筋運搬  
コンクリート等

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・10tダンプ：約3台×4回/日・トレーラー：約3台/日

10tタンクローリー：約2台/日・パキューム：1台/日

令和7年11月

配水池工事：基礎杭工、基礎工、土工、杭残土運搬

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：支障木伐採

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、基礎杭運搬、セメント運搬、杭残土運搬、管材運搬、碎石運搬、鉄筋運搬  
コンクリート等

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約3台×4回/日・トレーラー：約3台/日

10tタンクローリー：約2台/日・パキューム：1台/日・ミキサー車：18台/月・ポンプ車：2台/月

## ● 令和7年 9月の工事写真

配水池工事  
基礎杭打設状況



配水池工事  
基礎杭打設状況



配水池工事  
杭頭処理状況



## ● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：藏満 亮馬（くらみつりょうま）
- (2) 所属：三国産業 株式会社
- (3) 担当：基礎杭工事
- (4) 自己紹介



出身地は大阪府です。杭工事の施工管理に従事して5ヶ月になります。工事の担当は主に大型の重機を使用して施工する工事の管理業務です。

まだ経験が浅くわからないこともありますが、1日1日を大切に、1日でも早く一人前になれるよう、安全作業で頑張っています。どうぞ宜しくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



## ● お問い合わせ先

### 【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

