

家原寺配水場配水池更新工事
工事通信 令和7年 12月

【第38号】
大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体
DNC・
Kubota
JOINT VENTURE


進捗率：78.5% 令和7年11月末時点

師走に入り、寒さもますます強まってまいりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年12月			令和8年1月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	杭頭処理工			受台工、付帯配管		運搬／管材等
配水池工事 No.1	土工、基礎工			土工、基礎工、足場工		
配水池工事 No.1	運搬／鉄筋、コンクリート等			運搬／鉄筋、コンクリート等		
場内配管工事	運搬／管材等			土工、既設管撤去		運搬／産業廃棄物
設備工事		配管			配管	運搬／管材等
場内整備工事		運搬／管材等			植栽工、フェンス工事	運搬／木くず、フェンス等

● 施工箇所（平面図）

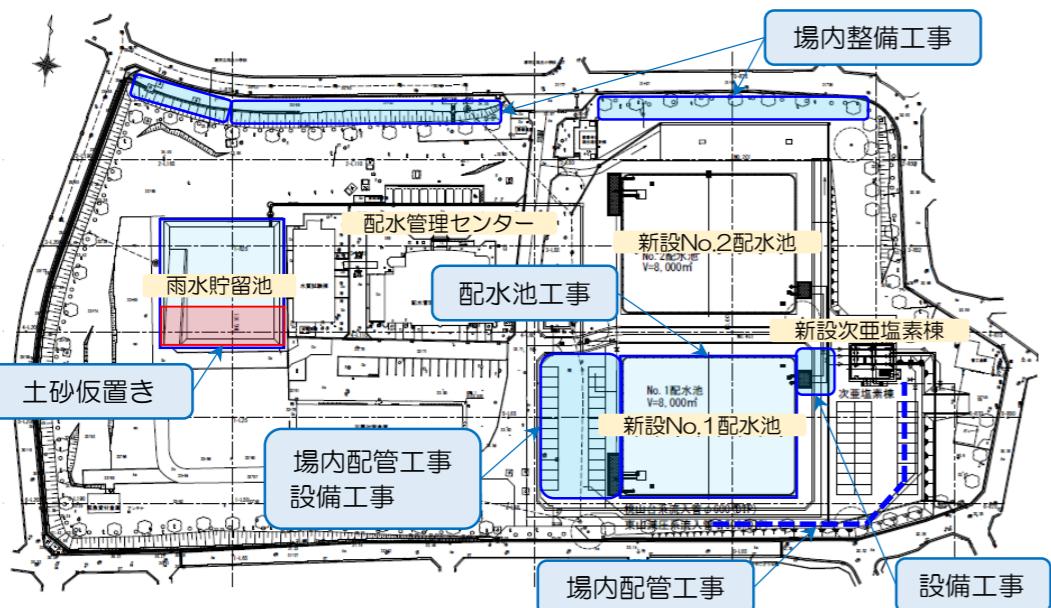

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。※年末年始長期休暇：12月27日から1月4日までの予定

コンクリート打設作業に伴い、コンクリートミキサー車の入退場が大変多くなる日がございます。コンクリート打設作業日につきましては各掲示板に週間工程表を掲示させて頂きますので、ご確認をお願い致します。交通誘導員を配置し、交通災害防止に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和7年12月
配水池工事：杭頭処理工、基礎工、土工、ステンレスタンク組立
場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工
設備工事：配管工
場内整備工事：支障木伐採
運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、鉄筋運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材等
・工事用車両の通行予定
普通車：約15台/日・10tトラック：約15台/月・ミキサー車：150台/月・ポンプ車：3台/月、
クレーン：2台/日

令和8年1月
配水池工事：基礎杭工、基礎工、土工、ステンレスタンク組立
場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工
設備工事：配管工
場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事
運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、鉄筋運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材等
・工事用車両の通行予定
普通車：約15台/日・10tトラック：約20台/月・ミキサー車：380台/月・ポンプ車：6台/月、
クレーン：2台/日

● 令和7年 11月の工事写真




● 今月のトピックス

基礎杭の打設が完了しまして、現在は基礎工の作業を開始しております。コンクリート打設量が多いことから分割してコンクリート打設作業を行います。コンクリート打設作業に伴いまして、コンクリートミキサー車の入退場が多くなります。基礎工の完了は来年2月までかかる見込みとなっております。近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、環境・安全には十分注意してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【施工状況】



【平面図】



【コンクリート打設詳細図】



工事の際はご近所の皆様に何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、
ご協力くださいますようお願いします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

●お問い合わせ先

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。



【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）
