

家原寺配水場配水池更新工事

工事通信

令和8年 1月

【第39号】

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体


進捗率：81.1% 令和7年12月末時点

寒に入り寒さが厳しくなってまいりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和8年1月			令和8年2月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1		杭頭処理、受台工、付帯配管			杭頭処理、受台工、側板工	
		運搬／管材等		運搬／タンク資材、機材		
	土工、基礎工、足場工			土工、基礎工、足場工		
	運搬／鉄筋、コンクリート等			運搬／コンクリート等		
	土工、既設管撤去、配管				土工、配管	
	運搬／管材、産業廃棄物等				運搬／管材等	
配水池工事 No.1						
場内配管工事						
設備工事	配管					配管
場内整備工事	運搬／管材等				運搬／管材等	
		植栽工、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事				
		運搬／排水資材、フェンス資材、ブロック、重機、産業廃棄物等				

● 施工箇所（平面図）

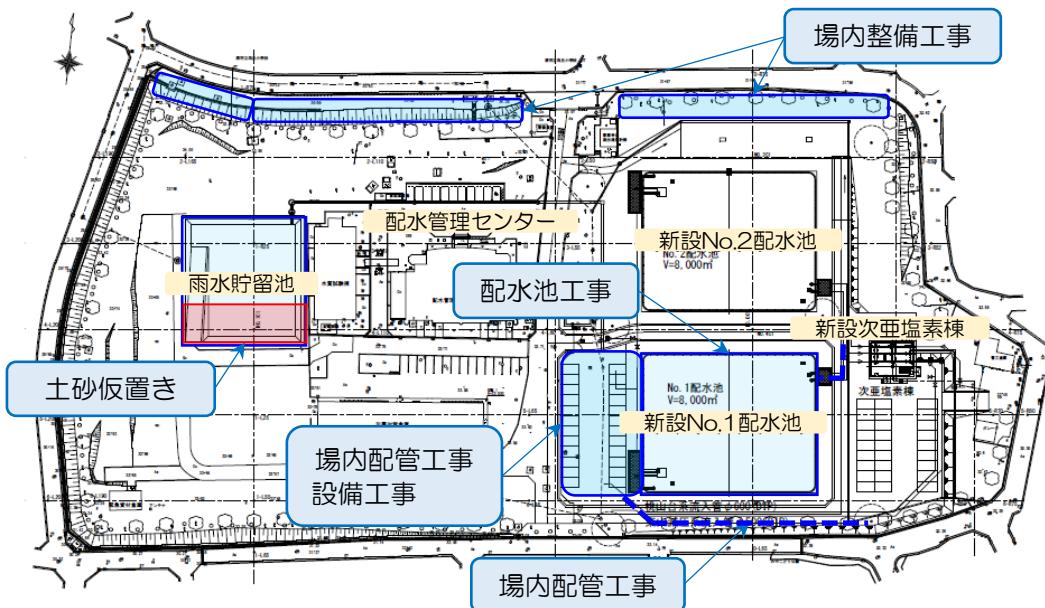

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。

コンクリート打設作業に伴い、コンクリートミキサー車の入退場が大変多くなる日がございます。コンクリート打設作業日につきましては各掲示板に週間工程表を掲示させて頂きますので、ご確認をお願い致します。交通誘導員を配置し、交通災害防止に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和8年1月

配水池工事：基礎杭工、基礎工、土工、ステンレスタンク組立

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

設備工事：配管工

場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、鉄筋運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材等

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約20台/月・ミキサー車：380台/月・ポンプ車：8台/月、

クレーン：2台/日

令和8年2月

配水池工事：基礎工、土工、ステンレスタンク組立

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、鉄筋運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材等

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・ミキサー車：180台/月・ポンプ車：5台/月、

クレーン：2台/日

● 令和7年 12月の工事写真

基礎杭工事
杭頭処理状況



基礎工事
鉄筋加工組立状況



設備工事
弁室配管状況




● 今月のトピックス

昨年11月末頃から下記の平面図のとおり、イルミネーションを設置しております。景観及び道路の線形がカーブになっており、見通しが悪い箇所と隣接する向丘小学校の裏門になる箇所で、放課後に児童の送迎がありますので、少しでも視認性が向上し、事故の抑制に繋がればと思い設置しております。また、堺市上下水道局 家原寺配水場の正門横に完成イメージ看板を設置しましたので、お知らせさせて頂きます。近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、環境・安全には十分注意して工事を行ってまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【設置状況】



【平面図】



工事の際はご近所の皆様に何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



●お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

T E L：072-360-4033

F A X：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

