

家原寺配水場配水池更新工事

【第40号】



令和8年 2月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：84.2% 令和8年1月末時点

寒さのなかにも春の訪れを感じる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年6月26日

工種	令和8年2月			令和8年3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1		受台工、底版工、側版工 運搬/タンク資材、足場材		底版工、側版工 運搬/タンク資材、足場材		
配水池工事 No.1		土工、基礎工、足場工 運搬/鉄筋、コンクリート等				
場内配管工事			土工、既設管撤去、配管 運搬/管材、産業廃棄物等			
設備工事						
場内整備工事	植栽工、フェンス工事、排水構造物工事			植栽工、フェンス工事、排水構造物工事		
		運搬/排水資材、フェンス資材、重機、産業廃棄物等				

● 施工箇所（平面図）

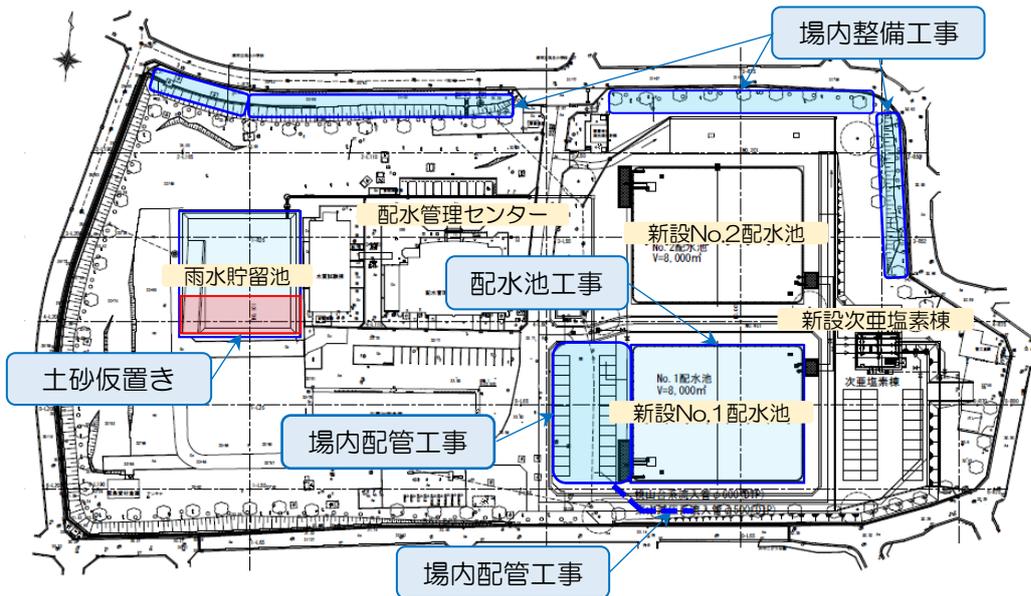

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。※工期末を令和8年3月18日から令和8年6月26日まで延期しました。

コンクリート打設作業に伴い、コンクリートミキサー車の入退場が大変多くなる日がございます。コンクリート打設作業日につきましては各掲示板に週間工程表を掲示させて頂きますので、ご確認をお願い致します。交通誘導員を配置し、交通災害防止に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。


● 作業内容

<p>令和8年2月</p> <p>配水池工事：基礎杭工、基礎工、土工、ステンレスタンク組立</p> <p>場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工</p> <p>場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事</p> <p>運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材等</p> <p>・工事用車両の通行予定</p> <p>普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・ミキサー車：180台/月・ポンプ車：4台/月、 クレーン：2台/日</p>
<p>令和8年3月</p> <p>配水池工事：基礎工、土工、ステンレスタンク組立</p> <p>場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工</p> <p>場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事</p> <p>運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材等</p> <p>・工事用車両の通行予定</p> <p>普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・クレーン：1台/日</p>

● 令和8年 1月の工事写真

<p>基礎工事 コンクリート打設状況</p> 	<p>場内配管工事 配管状況</p> 	<p>場内配管土工 埋戻し状況</p> 
---	---	--

● 今月の現場従事者 紹介

<p>(1) 名前：岩舘 直斗 (いわだて なおと)</p> <p>(2) 所属：大日本土木(株) 西日本支社 土木工事部</p> <p>(3) 担当：施工管理</p> <p>(4) 自己紹介</p> <p>2025年4月より当作業所に配属となりました、大日本土木株式会社の岩舘と申します。現場では施工管理を担当しており、入社9年目になります。出身は神奈川県ですが、入社以来、海外勤務が中心で、アフリカを含む複数の国の現場にて業務に従事してまいりました。最後まで精一杯、現場管理に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。</p>	
---	---

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所
住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1 (家原寺配水場内)
TEL：072-360-4033
FAX：072-360-4173
担当者：塩尻 (現場代理人)、岡田 (現場職員)

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

