

家原寺配水場配水池更新工事

【第41号】



令和8年 3月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：86.1% 令和8年2月末時点

日差しが春のおとずれを告げる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年6月26日

工種	令和8年3月			令和8年4月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	底板工、側版工、足場工 運搬/タンク資材、足場材			底板工、側版工、足場工 運搬/タンク資材、足場材		
配水池工事 No.1	土工、基礎工、足場工 運搬/鉄筋、コンクリート等			基礎工 運搬/コンクリート等		
場内配管工事	土工、既設管撤去、配管 運搬/管材			既設管撤去、配管 産業廃棄物等		
設備工事				電気設備工事		
場内整備工事	植栽工、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池工事 運搬/排水資材、フェンス資材、重機、産業廃棄物等			フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池工事		

● 施工箇所（平面図）

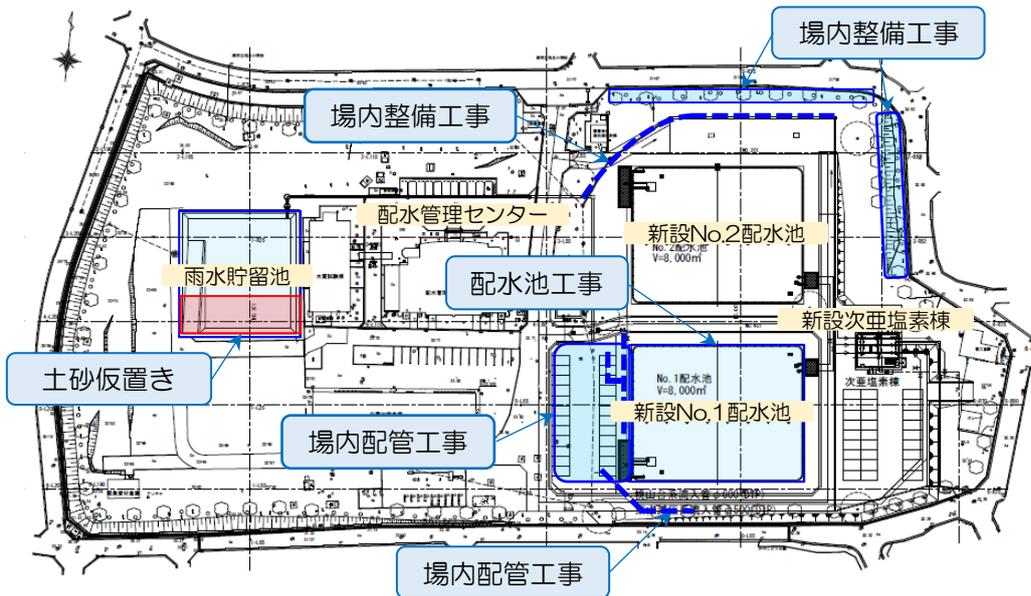

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。※工期末を令和8年3月18日から令和8年6月26日まで延期しました。

基礎工、約3000㎡のコンクリート打設作業につきましては、3月11日で完了しました。ご協力ありがとうございました。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和8年3月

配水池工事：基礎工、土工、ステンレスタンク組立

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、型枠材運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材等

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・ミキサー車：100台/月・ポンプ車：2台/月、

クレーン：2台/週

令和8年4月

配水池工事：基礎工、土工、ステンレスタンク組立

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材、基礎ブロック等

・工事用車両の通行予定

普通車：約20台/日・10tトラック：約15台/月・ミキサー車：5台/月・ポンプ車：1台/月、

クレーン：2台/週

● 令和8年 2月の工事写真

ステンレスタンク
組立状況



ステンレスタンク
溶接状況



場内整備工事
フェンス設置状況



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：山口 大知（やまぐち だいち）
- (2) 所属：森松工業株式会社
- (3) 担当：ステンレスタンク築造
- (4) 自己紹介



私の出身地は岐阜県です。一度建設業を離れましたが、二年ほど前から再び建設業に携わっています。経験はまだ浅いですが、何よりも「安全最優先」を心掛けています。皆さんが無事故で安全に現場を終えられるよう、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

