

家原寺配水場配水池更新工事

【第42号】

✳️ 工事通信

令和8年 4月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：86.7% 令和8年3月末時点

春の暖かさが感じられる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年6月26日

工種	令和8年4月			GW 休暇・休工期間（暦通り） 5月2日（土）～5月6日（水）	令和8年5月		
	上旬	中旬	下旬		上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	側版工、内部補強工、足場工 運搬/タンク資材、足場材				内部補強工、天井版工 運搬/タンク資材		
場内配管工事	土工、既設管撤去、配管				土工、既設管撤去、配管 運搬/管材、産業廃棄物等		
設備工事	電気設備工事、複合工 運搬/コンクリート						
場内整備工事	植栽工、フェンス工事、排水構造物工事 運搬/基礎ブロック、フェンス等				フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池工事 運搬/基礎ブロック、フェンス等		

● 施工箇所（平面図）

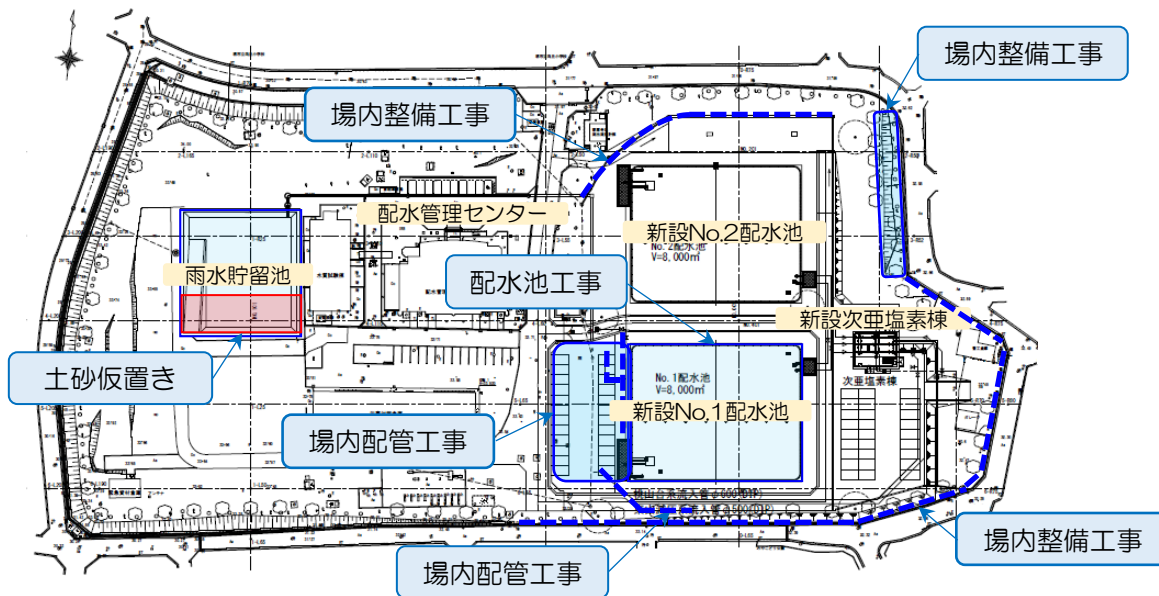

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）

ゴールデンウィーク期間につきまして、当作業所は暦通りで作業を実施致します。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和8年4月
 配水池工事：ステンレスタンク組立、仮設工、土工
 場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工、仮設工
 設備工事：複合工、電気設備工事
 場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、既設構造物撤去工事、仮設工
 運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材、基礎ブロック等
 ・工事用車両の通行予定
 普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・ミキサー車：2台/月・ポンプ車：1台/月、
 クレーン：2台/週

令和8年5月
 配水池工事：ステンレスタンク組立、土工
 場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工
 設備工事：複合工、電気設備工事
 場内整備工事：支障木伐採、フェンス工事、排水構造物工事、既設構造物撤去工事、仮設工
 運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材、基礎ブロック等
 ・工事用車両の通行予定
 普通車：約20台/日・10tトラック：約20台/月・クレーン：2台/週

● 令和8年 3月の工事写真




● 今月のトピックス

フェンス工事についてお知らせ致します。現在、老朽化したフェンスの更新工事を1月下旬より実施しております。更新箇所につきましては下記平面図のとおりです。更新工事は敷地境界付近での作業となるため、近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、環境・安全には十分注意してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


【施工状況写真】



【参考図】

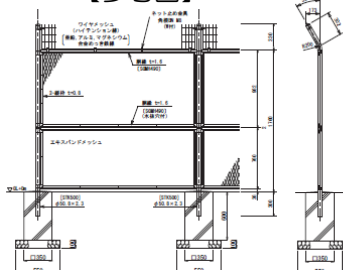

【平面図】



【凡例】

- 更新済み箇所
- 更新する箇所

令和8年3月31日時点

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
 何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
 「家原寺配水池配水更新工事」
 の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
 堺 家 原 寺 配 水 作 業 所
 住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水池内）
 TEL：072-360-4033
 FAX：072-360-4173
 担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
 お気軽にご連絡ください。

