

家原寺配水場配水池更新工事

【第43号】

✳️ 工事通信

令和8年 5月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：96.0% 令和8年4月末時点

風薫るさわやかな季節となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年6月26日

工種	令和8年5月			令和8年6月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	側版工、内部補強工、天井版工、付帯工、足場工			運搬/機材等		
	運搬/タンク資材、足場材			運搬/管材、産業廃棄物等		
場内配管工事	土工、既設管撤去、配管			土工、既設管撤去、配管		
				電気設備工事、複合工		
設備工事				運搬/資機材等		
場内整備工事	植栽工、フェンス工事、排水構造物工事、雨水貯留池護岸ブロック工事			運搬/基礎ブロック、フェンス、側溝、植樹等		

● 施工箇所（平面図）

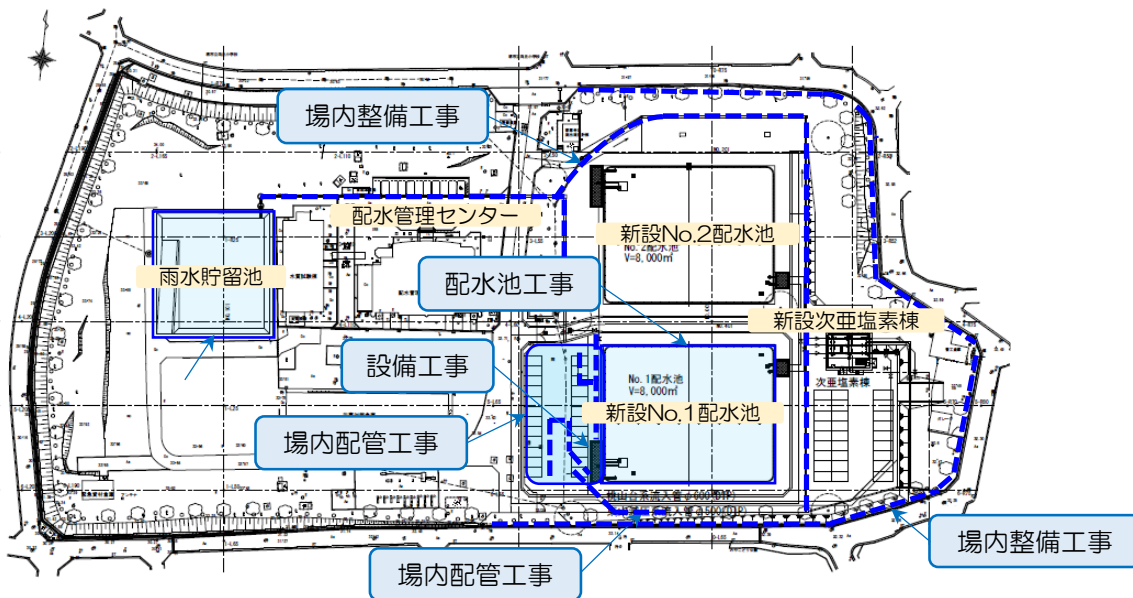

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和8年5月

配水池工事：ステンレスタンク組立、仮設工

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工、仮設工

設備工事：複合工、電気設備工事

場内整備工事：フェンス工事、排水構造物工事、既設構造物撤去工事、雨水貯留池護岸ブロック工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材、基礎ブロック等

・工事用車両の通行予定

普通車：約25台/日・10tトラック：約30台/月・クレーン：3台/週・ダンプ：1台/週

令和8年6月

配水池工事：ステンレスタンク組立、仮設工

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

設備工事：複合工、電気設備工事

場内整備工事：植栽工事、フェンス工事、排水構造物工事、既設構造物撤去工事、雨水貯留池護岸ブロック工事

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、配管材運搬、コンクリート、タンク部材、足場材、基礎ブロック等

・工事用車両の通行予定

普通車：約25台/日・10tトラック：約20台/月・クレーン：2台/週・ダンプ：1台/週

● 令和8年 4月の工事写真

ステンレスタンク
タンク組立状況



設備工事
地下燃料タンク 鉄筋組立状況



場内整備工事
既設構造物撤去状況



● 今月のトピックス

現在、各箇所において多岐にわたる工種の工事を実施しております。工種の増加に伴い、工事関係車両の入退場も多くなっております。そのため、交通誘導員を増員し、安全確保に十分配慮しながら工事を進めてまいります。近隣の皆様には、ご迷惑をお掛けしますが、環境・安全には十分注意してまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【場内配管工事】



【フェンス工事】



【排水構造物工事】



工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

