

家原寺配水場配水池更新工事

【第8号】



令和5年 6月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：12.9% 令和5年5月末時点

あじさいの色が美しく映えることとなりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年6月			令和5年7月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	既設No.2, 3配水池／解体工事 ← 殻運搬			土工・埋戻し ← 土運搬		
場内配管工事						
場内整備工事						
建築工事						

● 施工箇所（平面図）

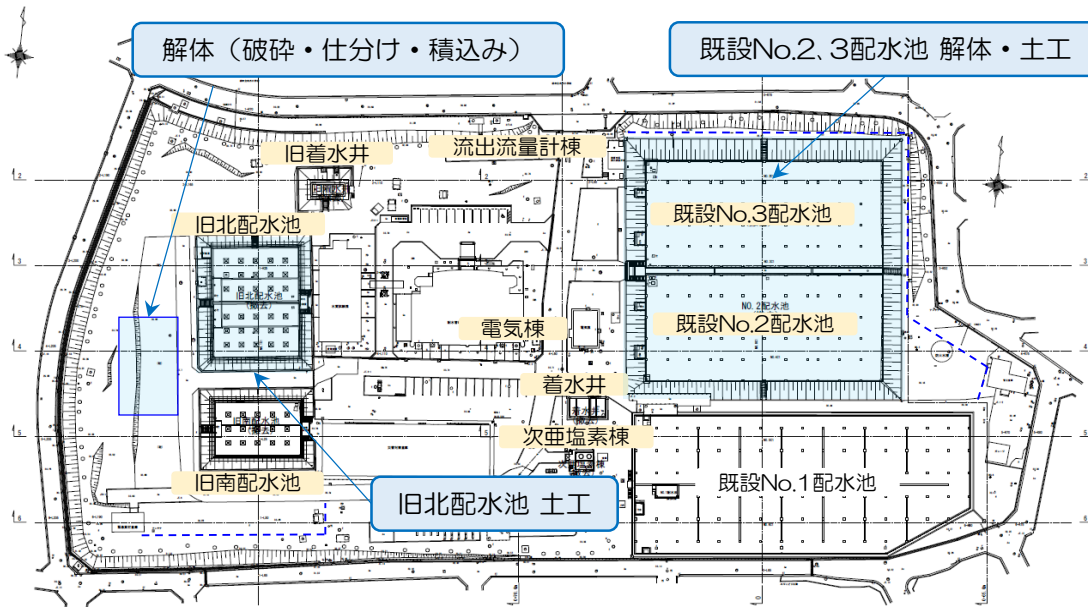

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

大型ダンプトラック等による産業廃棄物の搬出を行っております。また、6月上旬から既設No.2, 3配水池の解体完了後、土工作業としまして大型ダンプトラック及び重機を用いて埋戻しを開始します。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和5年6月

解体工事：東側の既設No.2、3配水池及び西側で解体工事

土工：東側の既設No.2、3配水池及び西側の旧北配水池で土工作业

運搬：コンクリート殻運搬、スクラップ等運搬、土砂運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約6台/日・4tトラック：約1台×2回/週・10tダンプ：約8台×6回/日

令和5年7月

土工：東側の既設No.2、3配水池で土工作业

運搬：土砂運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約6台/日・10tダンプ：約8台×6回/日

● 令和5年 5月の工事写真

既設No.2、3配水池
解体作業状況



交通誘導状況
(向丘小学校関係者共同)



向丘小学校 校外学習

家原寺校区老人クラブ
松寿会様の清掃に参加



● 今月のトピックス

・新入社員研修

当作業所に大日本土木(株)の新入社員研修として3名の来訪がありました。人手不足と言われている建設業界ですが、建設業界の人材問題は人手が不足しているだけではなく、高齢化という問題点もあります。新入社員は6月から各現場に配属される予定となっております。若い力でこれからの建設業界を引っ張っていただきたいと思います。



現場内での研修以外にも堺市上下水道局の職員様に講師となって頂きまして、堺市内の水運用に関する講話を頂くことができました。今回の研修を6月から始まる工事管理に活かしてもらえたらと思います。

写真①：現場内研修状況

写真②：堺市上下水道局の職員様による講話状況

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記の方までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体

堺 家 原 寺 配 水 作 業 所

住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1 (家原寺配水場内)

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田、児玉、田中（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

