

家原寺配水場配水池更新工事

【第9号】



令和5年 7月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：13.4% 令和5年6月末時点

日差しが日増しに夏らしくなってきました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和7年3月18日

工種	令和5年7月			令和5年8月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
準備工						
配水池工事 No.2	既設No.2, 3配水池 / 土工・埋戻し				お盆休み・1日（8月1日） （予定）	
	← 土運搬 →					
場内配管工事						
場内整備工事						
建築工事						

● 施工箇所（平面図）

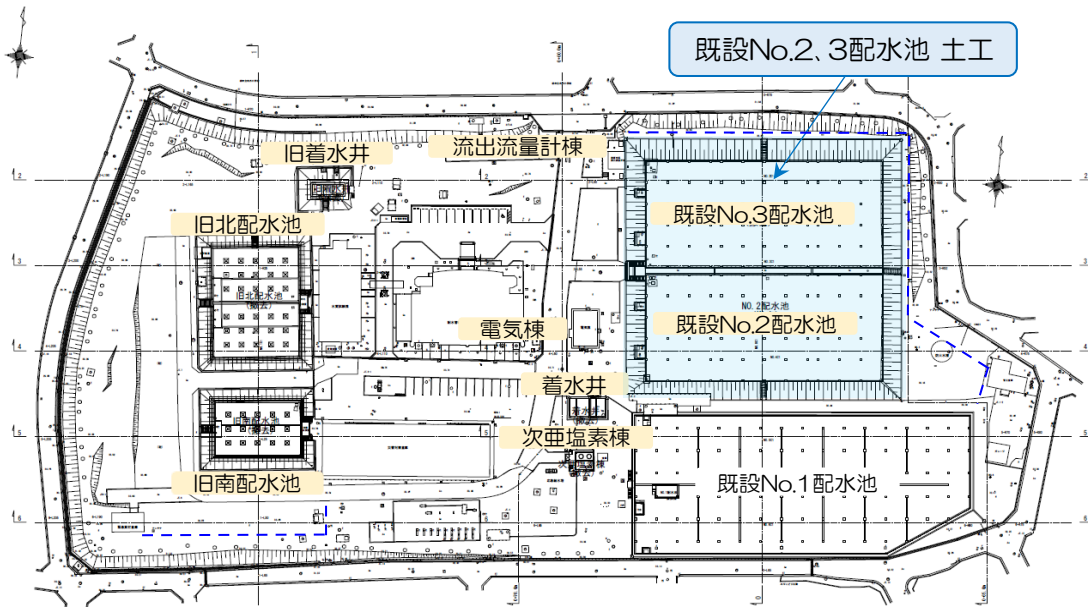

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

大型ダンプトラックで土砂の運搬を行っております。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容

令和5年7月
 土工：東側の既設No.2、3配水池で土工作業（埋戻し）
 運搬：土砂運搬

・工事用車両の通行予定
 普通車：約6台/日・10tダンプ：約10台×5回/日

令和5年8月
 土工：東側の既設No.2、3配水池で土工作業（埋戻し）
 運搬：土砂運搬

・工事用車両の通行予定
 普通車：約6台/日・10tダンプ：約10台×5回/日

● 令和5年 6月の工事写真

既設No.2、3配水池
既設構造物 撤去完了



既設No.2、3配水池
土工 埋戻し作業状況



6月上旬頃に既設No.2、3配水池の解体作業が完了しました。現在は次工程としまして大型ダンプトラック及び重機等を用いて埋戻しを行っております。



● 今月のトピックス

今年も熱中症が発症しやすい時期が来ました。熱中症は特に暑さに体が慣れていない5月末～7月上旬及びお盆休み等で長期に体を休めた場合は、体がリセットされ発症しやすい傾向にあり、熱中症を防ぐためにはそれぞれの場所に合った対策を取ることが重要と言われております。当作業所でも熱中症予防に関する注意喚起及び教育を実施して『みんなで気をつける』ことで熱中症ゼロを目指して取り組んでいきます。

- ・WBGT計（暑さ指数）を掲示
 - ・経口補水液、タブレット等を準備
 - ・冷蔵庫、ウォーターサーバーを準備
 - ・クーラー完備の休憩所を準備
- ※常にアップデートを行い、より良い作業環境を構築していきます。

WBGT計 掲示



熱中症対策キット準備



工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
 何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
 「家原寺配水場配水池更新工事」
 の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
 堺 家 原 寺 配 水 作 業 所
 住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）
 TEL：072-360-4033
 FAX：072-360-4173
 担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
 お気軽にご連絡ください。

