

家原寺配水場配水池更新工事



令和7年 3月

【第29号】

大日本土木・クボタ・今重  
建設工事共同企業体




進捗率：65.7% 令和7年2月末時点

まだ寒さが残る中、春の気配を感じる頃となりました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

| 工種         | 令和7年3月             |            |    | 令和7年4月             |    |         |
|------------|--------------------|------------|----|--------------------|----|---------|
|            | 上旬                 | 中旬         | 下旬 | 上旬                 | 中旬 | 下旬      |
| 配水池工事 No.1 | 既設No.1配水池 解体工事     |            |    | 既設No.1配水池 解体工事     |    |         |
|            | 運搬/仮設材等            | 運搬/仮設材、重機等 |    | 運搬/重機等             | 運搬 | コンクリート殻 |
| 場内配管工事     |                    | 土工・配管工     |    |                    |    |         |
| 設備工事       | 電気設備工事・複合工         |            |    |                    |    |         |
| 場内整備工事     | 土工・擁壁工事            |            |    |                    |    |         |
|            | 運搬/コンクリート等         |            |    |                    |    |         |
| 場内整備工事     | 既設着水井・既設次亜塩素棟 解体工事 |            |    | 既設着水井・既設次亜塩素棟 解体工事 |    |         |
|            | 運搬/仮設材・産業廃棄物等      |            |    | 運搬/重機等             |    |         |

● 施工箇所（平面図）

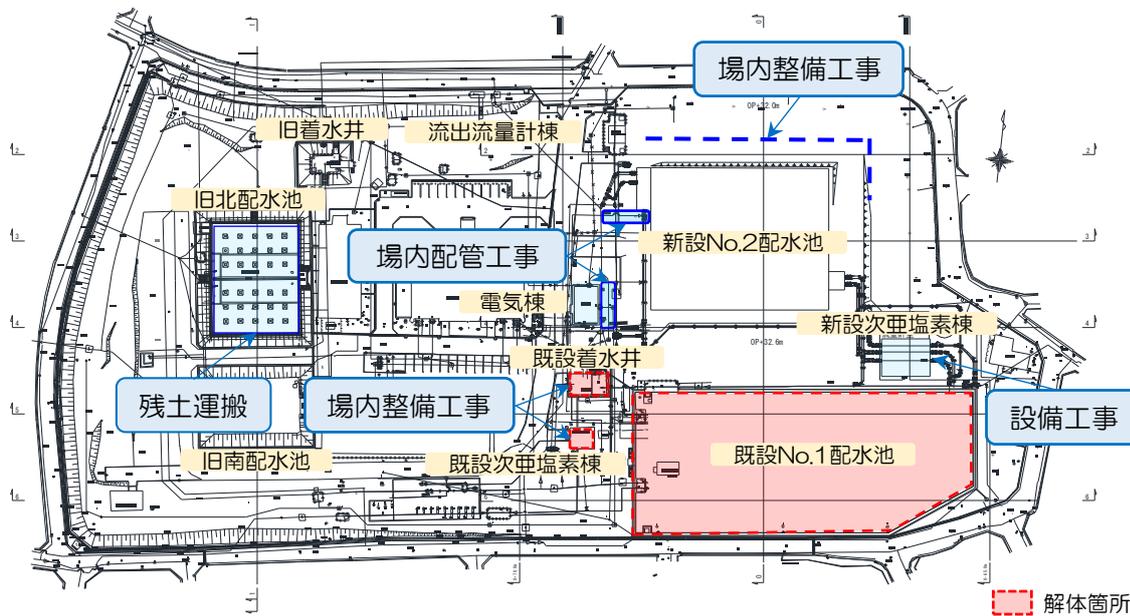

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）

重機作業及び大型工事車両の入退場は、午前9:00～午後5:00（予定）となります。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。

● 作業内容


|  |
|--|
| <p>令和7年3月</p> <p>配水池工事：既設No.1配水池撤去、仮設工、表土除去、解体</p> <p>設備工事：配水場内で電気設備工事</p> <p>場内配管工事：電機棟東側で土工、配管</p> <p>場内整備工事：新設No.2配水池北側で土工、擁壁工</p> <p>運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、コンクリート等運搬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用車両の通行予定</li> </ul> <p>普通車：約20台/日・10tトラック：約5台/月・10tダンプ：約10台/月・トレーラー：約3台/月</p> <p>ポンプ車：1台/月・ミキサー車：2台/月</p> |
| <p>令和7年4月</p> <p>配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻運搬</p> <p>場内整備工事：配水場内で土工、既設構造物撤去、解体、殻運搬</p>   |
| <p>運搬：重機運搬、産業廃棄物等運搬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事用車両の通行予定</li> </ul> <p>普通車：約15台/日・10tトラック：約5台/月・10tダンプ：約5台×6回/日・トレーラー：約3台/月</p>  |

● 令和7年 2月の工事写真



● 今月のトピックス

既設No.1配水池点検室（54㎡・0.007t）、既設着水井（199㎡・1.5t）、今回工事で行うアスベスト除去作業及び産業廃棄物の搬出が終わり、アスベスト除去に関する作業は全て完了しました。ご協力ありがとうございました。今後につきましては仮設工事を行った上で、解体工事を行います。

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>【既設着水井】</p>  | <p>【既設No.1配水池点検室】</p>  | <p>【平面図】</p>  | <p>【凡例】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アスベスト除去             <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設No.1配水池点検室</li> <li>・既設着水井</li> </ul> </li> <li>仮設工事             <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮囲い設置</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|---|--|

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。  
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ  
「家原寺配水場配水池更新工事」  
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体  
堺 家 原 寺 配 水 作 業 所  
住 所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）  
TEL：072-360-4033  
FAX：072-360-4173  
担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど  
お気軽にご連絡ください。

