

家原寺配水場配水池更新工事

【第33号】



令和7年 7月

大日本土木・クボタ・今重
建設工事共同企業体




進捗率：69.0% 令和7年6月末時点

小暑を過ぎ、夏本番を迎えました。日頃より家原寺配水場配水池更新工事にご協力をいただき誠にありがとうございます。

● 工事工程表（予定） 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日

工種	令和7年7月			令和7年8月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
配水池工事 No.1	既設No.1配水池 解体工事、切断撤去、土工、足場解体			夏期休暇・休工期間（予定） 8月13日～8月17日		
	運搬/コンクリート殻、土砂、機械等			地盤改良		
配水池工事 No.1				運搬/セメント		
場内配管工事				土工、既設管撤去、配管		
				運搬/管材等		
場内整備工事				雨水貯留池/土工		
				運搬/碎石、ブロック等		
場内整備工事	植栽工事/伐採、伐根					

● 施工箇所（平面図）

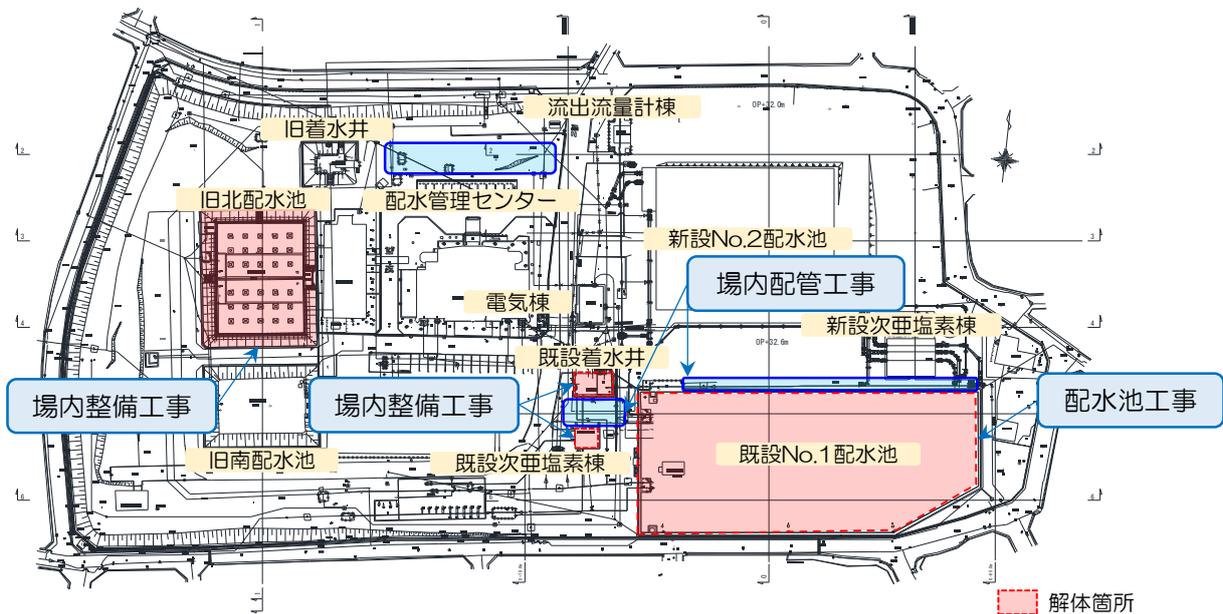

作業時間帯は午前8:00～午後5:00（予定）、重機作業及び大型工事車両の入退場は午前9:00～午後5:00（予定）となっております。

現在、産業廃棄物の搬出及び土砂等の搬入に伴い、ダンプ車両の入退場が大変多くなっております。また、解体工事に伴う騒音や振動により近隣の皆さまにはご迷惑をお掛けしておりますが、できる限り慎重に機械操作を行い、騒音・振動の低減に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※詳細につきましては、各掲示板の週間工程表を参照して下さい。夏季休暇は8月13日から17日までの予定です。

● 作業内容

令和7年7月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工、土砂等運搬、地盤改良

場内整備工事：植栽工（伐採、伐根）

運搬：重機等運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約10台/月・10tダンプ：約3台×6回/日・10tダンプ：約18台×3回/日

クレーン：1台/週・トレーラー：約1台/月

令和7年8月

配水池工事：既設No.1配水池撤去、解体、殻等運搬、土工、土砂等運搬、地盤改良、基礎杭工

場内配管工事：土工、既設管撤去、配管工

場内整備工事：雨水貯留池護岸ブロック工

運搬：重機運搬、産業廃棄物運搬、土砂等運搬

・工事用車両の通行予定

普通車：約15台/日・10tトラック：約20台/月・10tダンプ：約3台×6回/日・10tダンプ：約18台×3回/日

クレーン：1台/週・トレーラー：約2台/日・10tタンクローリー：約1台/日

● 令和7年 6月の工事写真

配水池工事
解体作業状況



配水池工事
切断撤去作業状況



配水池工事
切断撤去作業状況



● 今月の現場従事者 紹介

- (1) 名前：吉田 涼太郎（よしだ りょうたろう）
- (2) 所属：株式会社笑栄
- (3) 担当：コンクリート切断撤去工事
- (4) 自己紹介



お疲れ様です。笑栄の吉田です。5月から堺家原寺配水作業所でダイヤモンド工法によるコンクリート解体工事を行っております。今回の工事では古くなったコンクリート構造物を細かく分割して切断し、クレーンを用いて撤去を行っています。切断したコンクリート構造物は重量物なので、挟まれや落下などないように日々緊張感を持って作業を行っています。常に安全第一で工事を進めて参ります。よろしくお願い致します。

工事の際はご近所の皆様には何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、何卒ご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。
何かご不明な点やお気づきのことがございましたら、下記までご連絡下さい。

堺市上下水道局 ホームページ
「家原寺配水場配水池更新工事」
の情報へ



● お問い合わせ先

【施工業者】

大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体
堺家原寺配水作業所

住所：大阪府堺市西区家原寺町2-21-1（家原寺配水場内）

TEL：072-360-4033

FAX：072-360-4173

担当者：塩尻（現場代理人）、岡田（現場職員）

工事に関するお問合せなど
お気軽にご連絡ください。

