


# 出来形管理表(土工事)

年 月 日

工事名

現場代理人	施工管理担当者	測定者

- 掘削上幅 : A
- 掘削下幅 : B
- 新設管土被り : C
- 撤去管土被り : C'
- 継手掘削深・縦余掘深 : D
- 既設舗装厚 : E
- 既設路盤厚 : F
- 掘削深 : G
- 新管実外径 : H
- 撤去管・既設管実外径 : h
- 仮復旧舗装厚 : I
- 路盤厚 : J
- 掘削長・つぼ堀長 : L
- 官民境界までの距離(寄り) : S

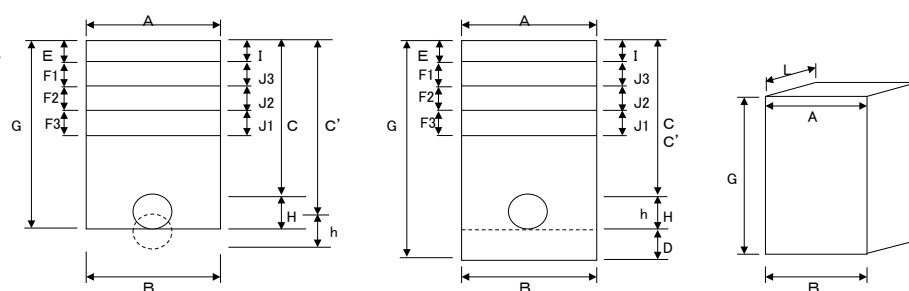

図面番号		/	/	/	/	/	/	/
測点 No.								
新設管外径	H							
既設管外径	h							
新設管土被り	C	設計						
		実測						
新設管の寄り	S	実測						
既設管土被り	C'	実測						
既設舗装厚	E	実測						
既設路盤厚	F1	設計						
		実測						
	F2	設計						
		実測						
	F3	設計						
		実測						
掘削上幅	A	設計						
		実測						
掘削下幅	B	設計						
		実測						
掘削深	G	設計						
		実測						
路盤厚	J1	設計						
		実測						
	J2	設計						
		実測						
	J3	設計						
		実測						
仮復旧舗装厚	I	設計						
		実測						
掘削長 (つぼ掘り部)	L	設計						
		実測						
備考								
